



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/04

Data da Vistoria
25/01/2024

| | |
|---|---|
| Município Caatiba | Assunto Vistoria de Convênio |
| Interessado Prefeitura Municipal de Caatiba | Responsável Maria Tania Ribeiro Sousa |
| Contato Diego Oliveira Silva | Cargo Engenheiro |

Objeto
Reforma do Estádio Municipal

Endereço
Sede do Município

| | | | |
|--|---|--|--|
| Convênio 22/22 | Processo 069.1479.2022.0000181-59 | Nº de Parcelas 02 (duas) | Parcela Vistoriada 6ª Vistoria da 2ª Parcela |
| Publicação no D.O.E 14/05/2022 | | Valor do Convênio R\$ 805.744,69 | Valor da Parcela Vistoriada R\$ 401.799,06 |

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Caatiba, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, município de Caatiba, objeto do convênio nº 22/22 no valor de R\$ 805.744,69 (oitocentos e cinco mil e setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

| SERVIÇOS | 2ª PARCELA | | | CONVÊNIO | | |
|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | Valor Parc. | Valor Exec. | Perc. (%) | Valor Total | Valor Exec. | Porc. (%) |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 17.380,06 | 17.380,06 | 100,00% | 34.760,11 | 34.760,11 | 100,00% |
| CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 50,00M | 116.386,10 | 116.386,10 | 100,00% | 232.772,19 | 232.772,20 | 100,00% |
| BANCO DE RESERVAS | 13.396,12 | 13.396,12 | 100,00% | 26.792,24 | 26.792,24 | 100,00% |
| REFORMA DOS VESTIÁRIOS, BANHEIROS E MURETA | - | 0,00 | 0,00% | 2.371,20 | 2.371,20 | 100,00% |
| ACESSO, ALAMBRADO E CAMPO | 206.847,82 | 130.356,89 | 63,02% | 413.695,64 | 337.204,71 | 81,51% |
| DRENAGEM LATERAL ESTÁDIO | 47.564,34 | 32.251,27 | 67,81% | 95.128,68 | 79.815,61 | 83,90% |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 224,63 | 0,00 | 0,00% | 224,63 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 401.799,06 | 309.770,44 | 77,10% | 805.744,69 | 713.716,07 | 88,58% |

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 22/22, no valor de R\$ 401.799,06 (quatrocentos e um mil e setecentos e noventa e nove reais e seis centavos).

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Responsável. Carlos A. C. OLIVEIRA | Analista Técnico | Data do Relatório |
| Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antônio Almeida Brantes | Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9 | 26/01/2024 |

Carlos Antonio Carvalho de Oliveira
Analista Técnico Nivel B
Projeto FLEM/SUDES B


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras / SUDES B
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Caatiba, Convênio 22/22.

Foto 01- Placa da Obra.



Foto 02 – Arquibancada.

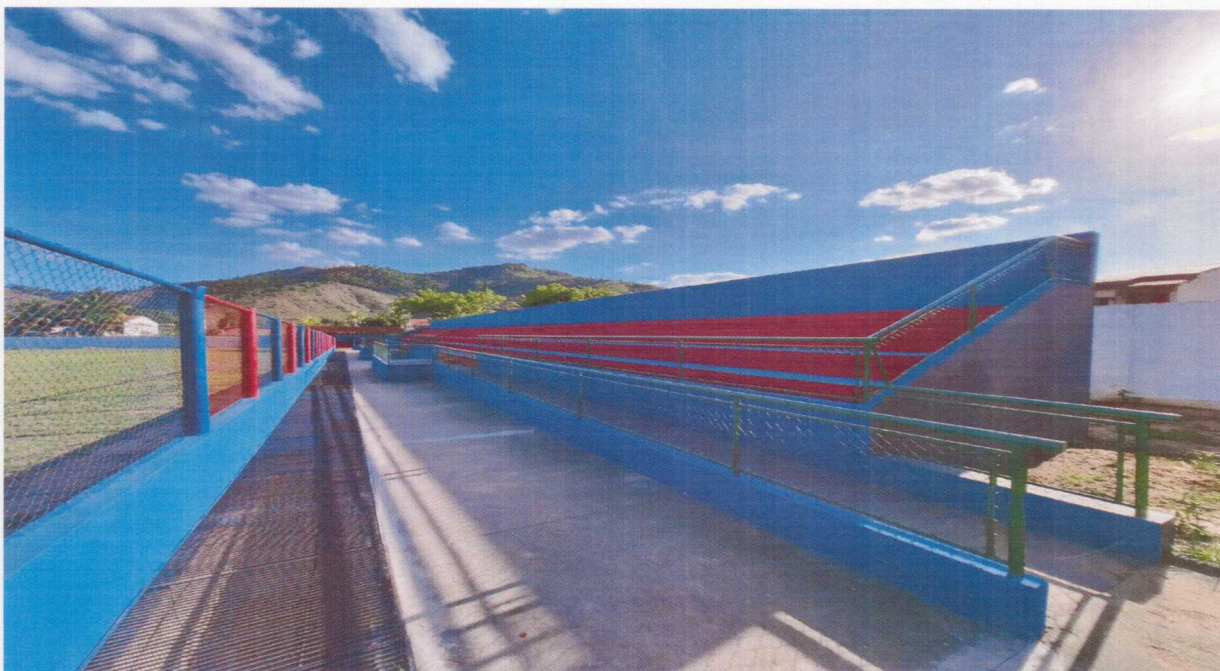

Assinado

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Caatiba, Convênio 22/22.

Foto 03 – Banco de reserva.



Foto 04 – Acesso, alambrado.




Escopo

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Caatiba, Convênio 22/22.

Foto 06 – Campo, sistema de irrigação.



FOTO 07 – VESTIÁRIO.

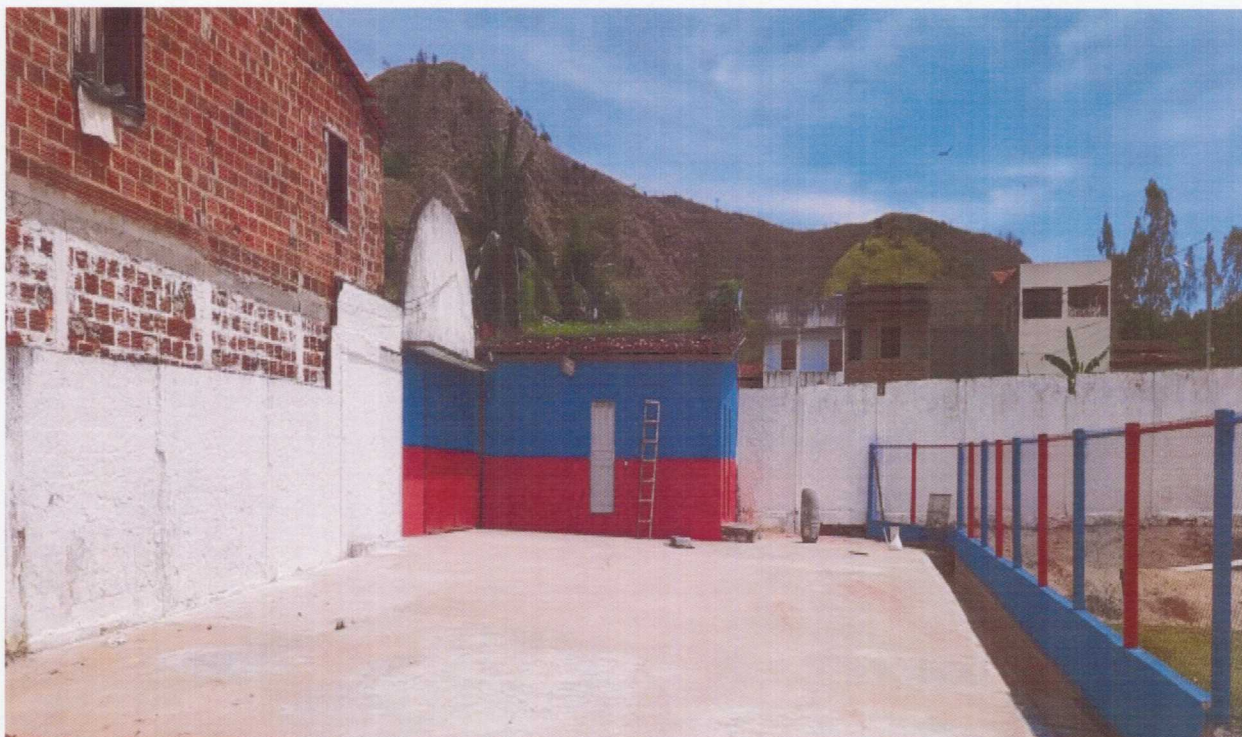

Handwritten signature
