	SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO <u>RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO</u>	FLS. 01/04
		Data da Vistoria 26/02/2024

Município Caatiba	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Caatiba	Responsável Maria Tania Ribeiro Sousa
Contato Diego Oliveira Silva	Cargo Engenheiro
Objeto Reforma do Estádio Municipal	

Endereço
Sede do Município

Convênio 22/22	Processo 069.1479.2022.0000181-59	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 7ª Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 14/05/2022		Valor do Convênio R\$ 805.744,69	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 401.799,06

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Caatiba, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, município de Caatiba, objeto do convênio nº 22/22 no valor de R\$ 805.744,69 (oitocentos e cinco mil e setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES	17.380,06	17.380,06	100,00%	34.760,11	34.760,11	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 50,00M	116.386,10	116.386,10	100,00%	232.772,19	232.772,20	100,00%
BANCO DE RESERVAS	13.396,12	13.396,12	100,00%	26.792,24	26.792,24	100,00%
REFORMA DOS VESTIÁRIOS, BANHEIROS E MURETA	-	0,00	0,00%	2.371,20	2.371,20	100,00%
ACESSO, ALAMBRADO E CAMPO	206.847,82	153.256,36	74,09%	413.695,64	360.104,18	87,05%
DRENAGEM LATERAL ESTÁDIO	47.564,34	32.251,27	67,81%	95.128,68	79.815,61	83,90%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	224,63	0,00	0,00%	224,63	0,00	0,00%
TOTAL	401.799,06	332.669,91	82,80%	805.744,69	736.615,54	91,42%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 22/22, no valor de R\$ 401.799,06 (quatrocentos e um mil e setecentos e noventa e nove reais e seis centavos).

Responsável. Nelson Rocha	Analista Técnico	Data do Relatório 28/02/2024
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antônio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	


Nelson Rocha
Engenheiro Civil / SUDESB
CAD:92085362
CREA-BA:3000077244


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras / SUDESB
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Caatiba, Convênio 22/22.
Foto 01 – Vista do Poço para irrigação

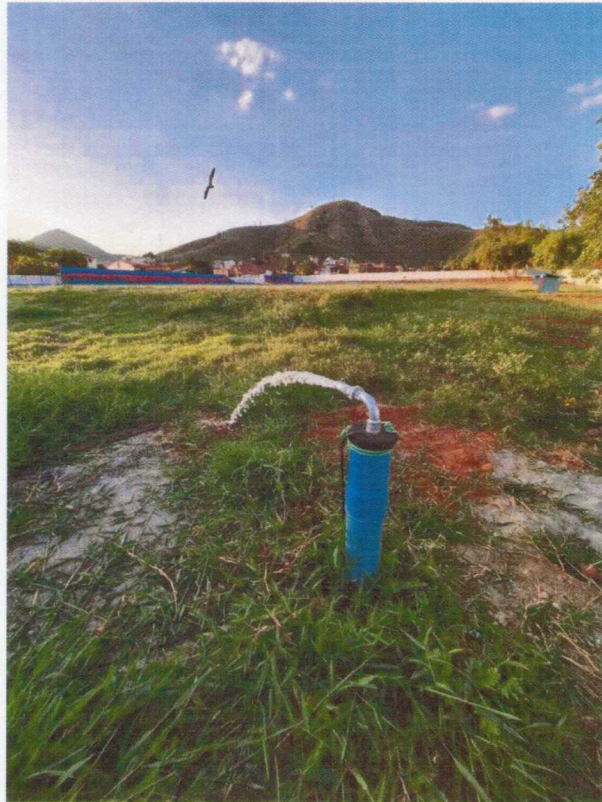


Foto 02 – Vista da arquibancada, acesso e pavimentação

