



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/04

Data da Vistoria  
22/11/2023

<b>Município</b> Jacobina	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Jacobina	<b>Responsável</b> Tiago Manoel Dias Ferreira
<b>Contato</b> Dinael Rios Freire	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Reforma do Estádio Municipal José Rocha,

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 17/22	<b>Processo</b> 069.1479.2022.0000582-91	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 3º Vistoria da 3ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 09/04/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 1.598.693,15	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 421.158,50

**LAUDO TECNICO:**

Em visita ao Município de Jacobina, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal José Rocha, município de Jacobina, objeto do convênio nº 17/22 no valor de R\$ 1.598.693,15 (um milhão e quinhentos e noventa e oito mil e seiscentos e noventa e três reais e quinze centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10.218,67	5.218,67	51,07%	30.656,00	25.437,34	82,98%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/0!	2.218,32	2.218,32	100,00%
REVESTIMENTO			#DIV/0!	182.529,38	182.529,38	100,00%
ESQUADRIAS			#DIV/0!	51.649,44	51.649,44	100,00%
COBERTURA			#DIV/0!	147.026,52	147.026,52	100,00%
PINTURA GERAL	77.372,89	71.374,89	92,25%	232.118,67	226.120,67	97,42%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			#DIV/0!	22.038,58	22.038,58	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	180888,62	180.888,62	100,00%	542.665,86	542.665,86	100,00%
PISTA DE CORRIDA	72735,60		0,00%	218.206,80	145.471,20	66,67%
DRENAGEM DO VESTIÁRIO	6041,14	6.041,14	100,00%	12.082,27	12.082,27	100,00%
MANUTENÇÃO DO GRAMADO	32101,72	2.000,00	6,23%	32.101,72	2.000,00	6,23%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	41799,86	1.799,86	4,31%	125.399,59	85.377,59	68,08%
<b>TOTAL</b>	<b>421.158,50</b>	<b>267.323,18</b>	<b>63,47%</b>	<b>1.598.693,15</b>	<b>1.444.617,17</b>	<b>90,36%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 3ª parcela do convênio nº 17/22, no valor de R\$ 421.158,50 (quatrocentos e vinte e um mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos). Não houve avanço devido a pedido de mudança de meta física que está para ser liberado.

<b>Responsável</b> :Carlos A.C. Oliveira.	<b>Cargo / Analista técnico.</b>	<b>Data do Relatório</b>  23/11/2023
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro/Arquiteto</b> CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Luiz Antonio Almeida Brantes  
Coordenador de Obras / SUDESB  
Cad. 69520107-9  
CAU A-12275-0

Carlos Antonio Carvalho de Oliveira  
Analista Técnico Nível B  
Projeto FLEM/SUDESB

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Rocha, Município de Jacobina,  
Convênio 17/22.

Foto 01 – Vista da ARQUIBANCADA.

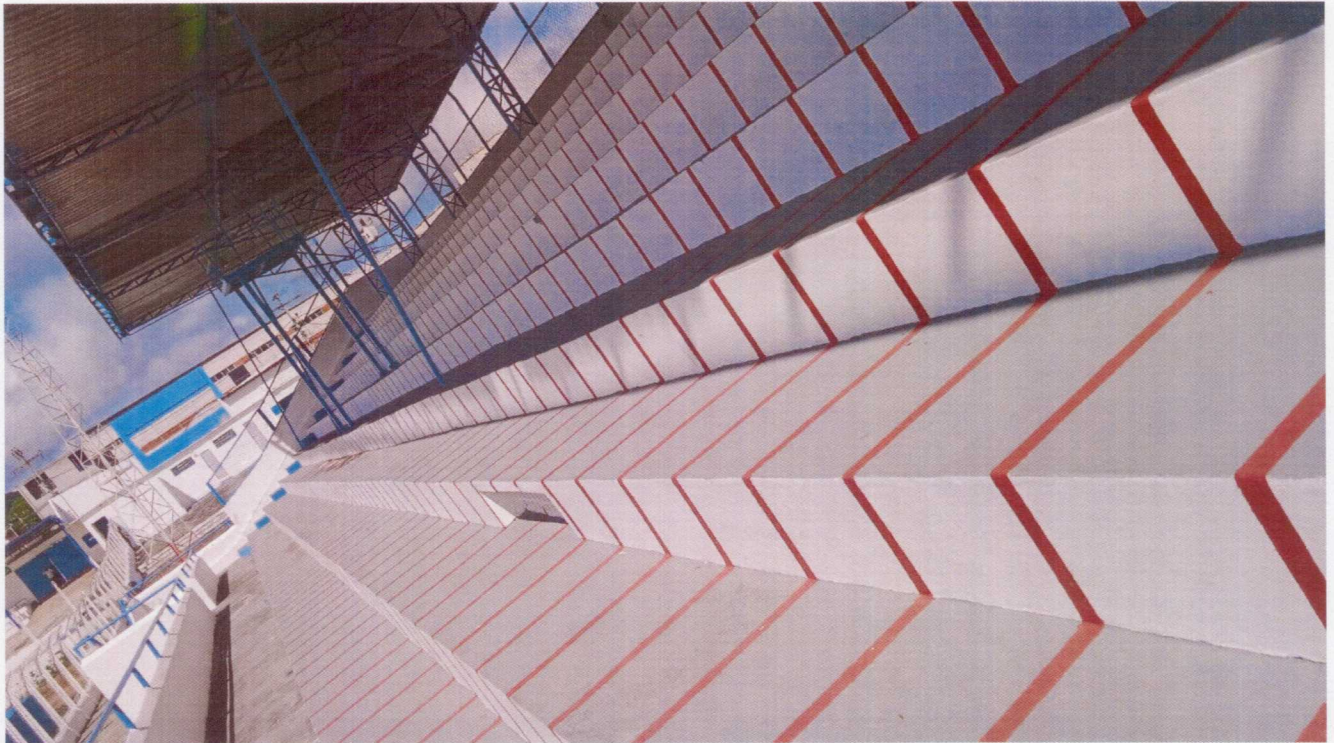


Foto 02 – Alambrado.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Rocha, Município de Jacobina,  
Convênio 17/22.

Foto 03 – PISTA DE CORRIDA...



Foto 04 – ESTRUTURA METALICA e Arquibancada.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten letter 'D']*

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Rocha, Município de Jacobina,  
Convênio 17/22.

Foto 05 – Poste com refletores.



Foto 06 – poste com refletores.



*[Handwritten signature]*
