



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/04

Data da Vistoria  
05/01/2024

<b>Município</b> Jacobina	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Jacobina	<b>Responsável</b> Tiago Manoel Dias Ferreira
<b>Contato</b> Dinael Rios Freire	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Reforma do Estádio Municipal José Rocha,

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 17/22	<b>Processo</b> 069.1479.2022.0000582-91	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 4º Vistoria da 3ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 09/04/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 1.598.693,15	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 421.158,50

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Jacobina, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal José Rocha, município de Jacobina, objeto do convênio nº 17/22 no valor de R\$ 1.598.693,15 (um milhão e quinhentos e noventa e oito mil e seiscentos e noventa e três reais e quinze centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15.234,85	7.818,67	51,32%	40.672,19	28.037,34	68,93%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/0!	2.366,71	2.366,71	100,00%
REVESTIMENTO			#DIV/0!	182.529,38	182.529,38	100,00%
ESQUADRIAS			#DIV/0!	51.649,44	51.649,44	100,00%
COBERTURA			#DIV/0!	147.026,52	147.026,52	100,00%
PINTURA GERAL	77.372,89	56.374,89	72,86%	232.118,67	211.120,67	90,95%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			#DIV/0!	22.038,58	22.038,58	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	180888,62	180.888,62	100,00%	542.665,86	542.665,86	100,00%
PISTA DE CORRIDA	83853,81		0,00%	156.589,41	145.471,20	92,90%
DRENAGEM DO VESTIÁRIO	6041,14	6.041,14	100,00%	12.082,27	12.082,27	100,00%
MANUTENÇÃO DO GRAMADO	32101,72	43.554,53	135,68%	83.554,53	43.554,53	52,13%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	41799,86	1.799,86	4,31%	125.399,59	85.377,59	68,08%
TOTAL	421.158,50	296.477,71	70,40%	1.598.693,15	1.473.920,09	92,20%

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 3ª parcela do convênio nº 17/22, no valor de R\$ 421.158,50 (quatrocentos e vinte e um mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos). Não houve avanço devido a de mudança de meta física.

<b>Responsável : Othon Batista</b>	<b>Cargo / Analista técnico.</b>	<b>Data do Relatório</b>  08/01/2024
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro/Arquiteto</b> CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Othon Batista dos Santos  
Analista Técnico Nivel B  
Projeto FLEM/SUDES B

Luiz Antonio Brantes  
Coord. de Obras/SUDES B  
CAD: 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Rocha, Município de Jacobina,  
Convênio 17/22.

Foto 01 – Vista da ARQUIBANCADA.

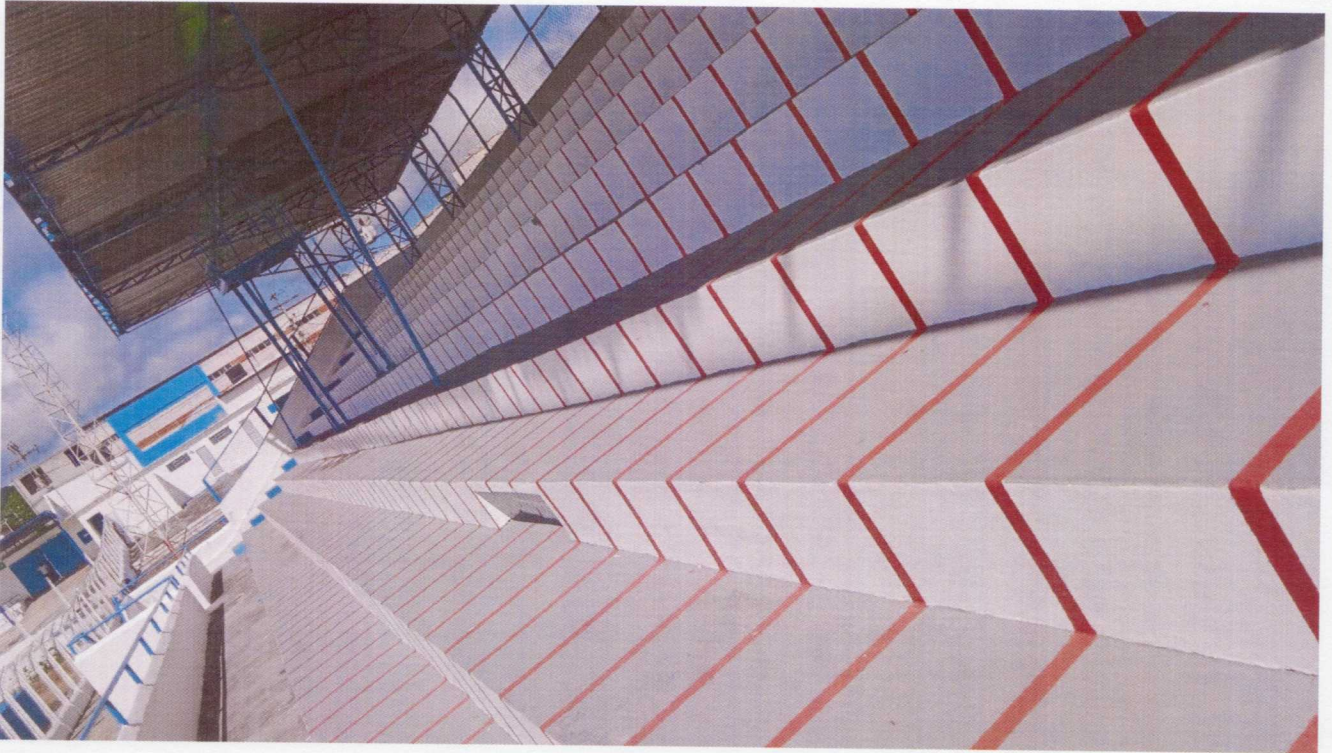


Foto 02 – Alambrado.



Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Rocha, Município de Jacobina,  
Convênio 17/22.

Foto 03 – PISTA DE CORRIDA...



Foto 04 – ESTRUTURA METALICA e Arquibancada.



Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Rocha, Município de Jacobina,  
Convênio 17/22.

Foto 05 – Poste com refletores.



Foto 06 – poste com refletores.





A large, stylized handwritten signature in blue ink, extending across the bottom left of the page.


A smaller, handwritten mark or signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Rocha, Município de Jacobina,  
Convênio 17/22.

Foto 07 – Vista geral do gramado.

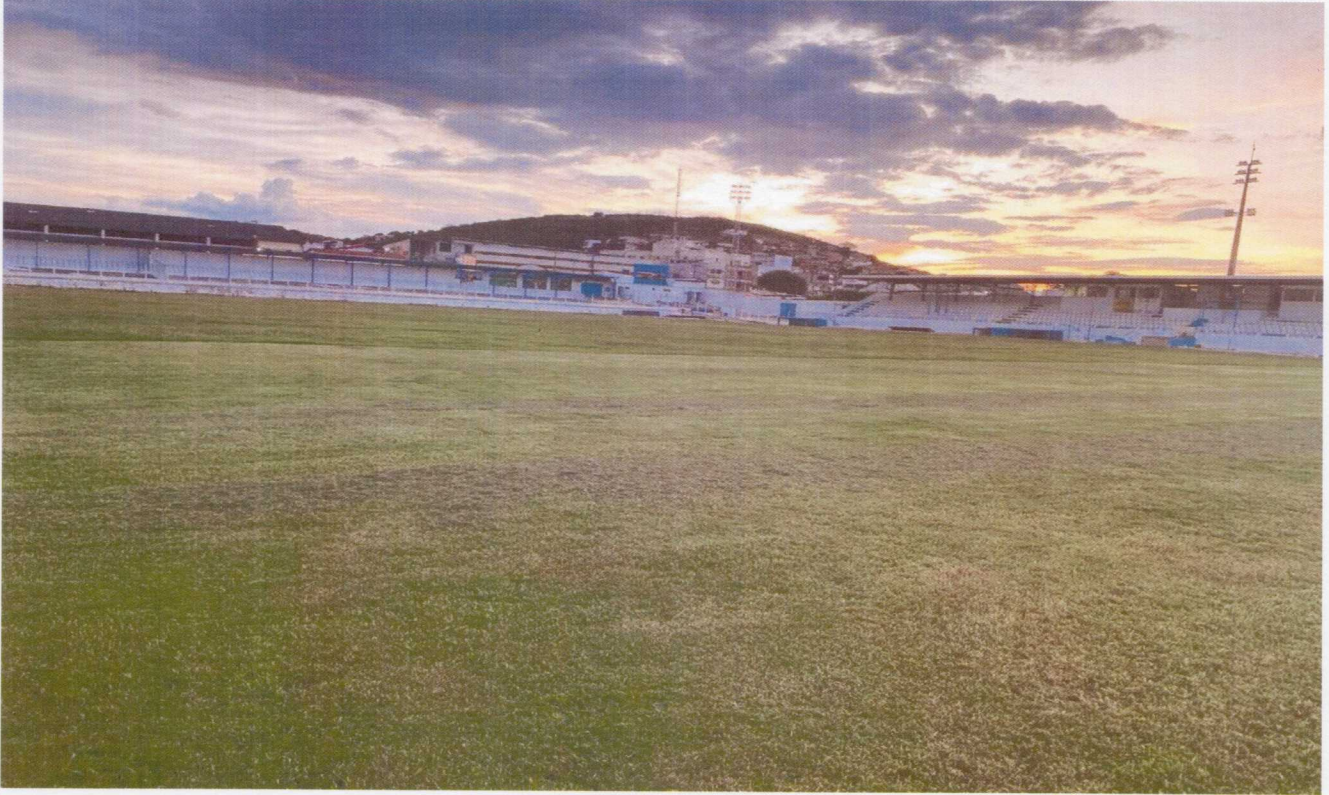

  
Luiz Antonio Brantes  
Coord. de Obras/SUDESBB  
CAD: 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

  
Othon Batista dos Santos  
Analista Técnico Nivel B  
Projeto FLEM/SUDESBB
