



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO.  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/05

Data da Vistoria  
10/MAIO/2024

<b>Município</b> Aratuípe	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Aratuípe	<b>Responsável</b> Antônio Marcos Araújo de Souza
<b>Contato</b> Gabriel Coelho Andrade	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Reforma do Estádio Municipal Rosival da Silva Leão

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 24/21	<b>Processo</b> 069.1486.2022.0003519-44	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1ª Vistoria da 3ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 30/12/2021		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 1.297.293,27	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 494.000,68

**LAUDO TECNICO:**

Em visita ao Município de Aratuípe, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Rosival da Silva Leão, município de Aratuípe, objeto do convênio nº 24/21 no valor de R\$ 1.297.293,27 (Um milhão, duzentos e noventa e sete mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.733,42	6.733,42	100,00%	20.200,24	20.200,24	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES			0,00%	5.519,64	5.519,64	100,00%
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ENTORNO	234.115,47	234.115,47	100,00%	438.233,70	438.233,70	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO AO REDOR DO CAMPO	119.639,91	119.639,91	100,00%	269.205,40	269.205,40	100,00%
RECUPERAÇÃO DE ARQUIBANCADA EXISTENTE	23.493,64	23.493,64	100,00%	70.489,91	70.489,91	100,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO	64.721,04	64.721,04	100,00%	161.802,61	161.802,61	100,00%
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES			100,00%	84.316,34	84.316,34	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	33.863,96	0,00	0,00%	101.591,88	84.659,90	83,33%
PAVIMENTAÇÃO			0,00%	96.709,62	29.013,00	30,00%
PAISAGISMO			0,00%	34.736,60	20.841,96	60,00%
EQUIPAMENTOS			0,00%	3.054,08	0,00	0,00%
TOTEM INSTITUCIONAL	11.433,25	0,00	0,00%	11.433,25	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>494.000,68</b>	<b>448.703,48</b>	<b>90,83%</b>	<b>1.297.293,27</b>	<b>1.134.427,74</b>	<b>87,45%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos não cumprida 3ª parcela do convênio nº 24/21, no valor de R\$ 494.000,68 (Quatrocentos e noventa e quatro mil e sessenta e oito centavos).


<b>Responsável</b> João Fernando Neres da Cruz	 João Fernando Neres da Cruz Analista Técnico Nível B Projeto FLEM/SUDES B	<b>Data do Relatório</b> 10/MAIO/2024
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9 Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Almeida Brantes  
Coordenador de Obras / SUDES B  
Cad. 69520107-9  
CAU A-12275-0





**Foto 01**—Vista do vestiário.

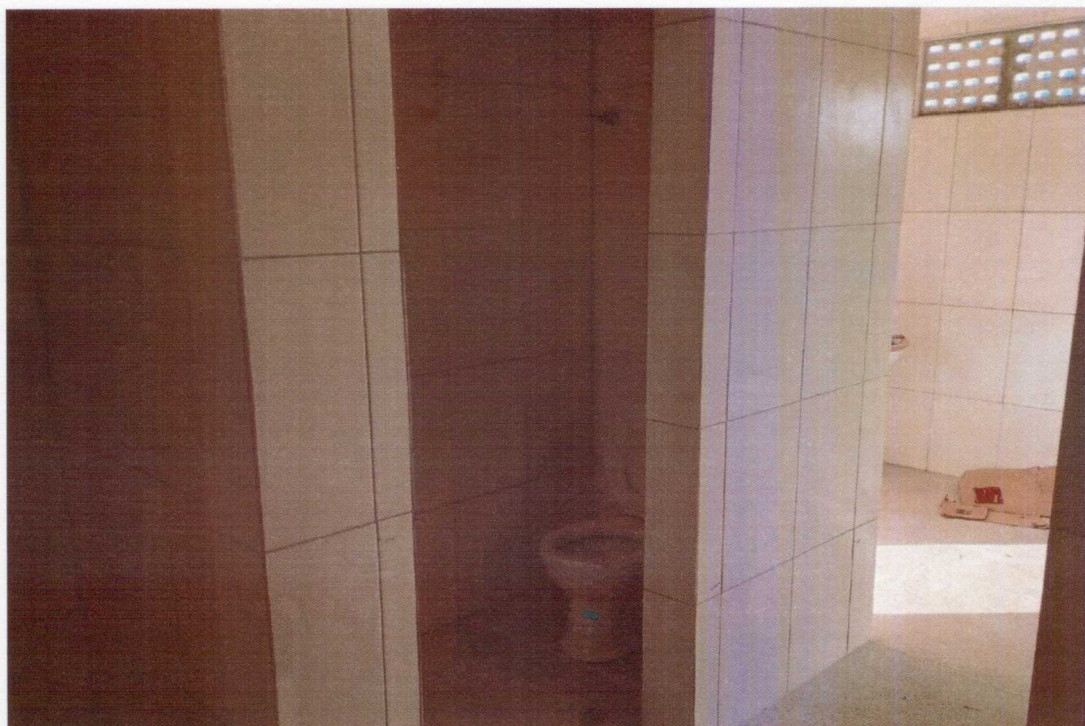

**Foto 02** – Vista interna do vestiário .

*[Handwritten signatures]*





Foto 03—Vista interna do vestiário.



Foto 04—Vista do quiosque

0

4/21





Foto 05—Vista interna do quiosque

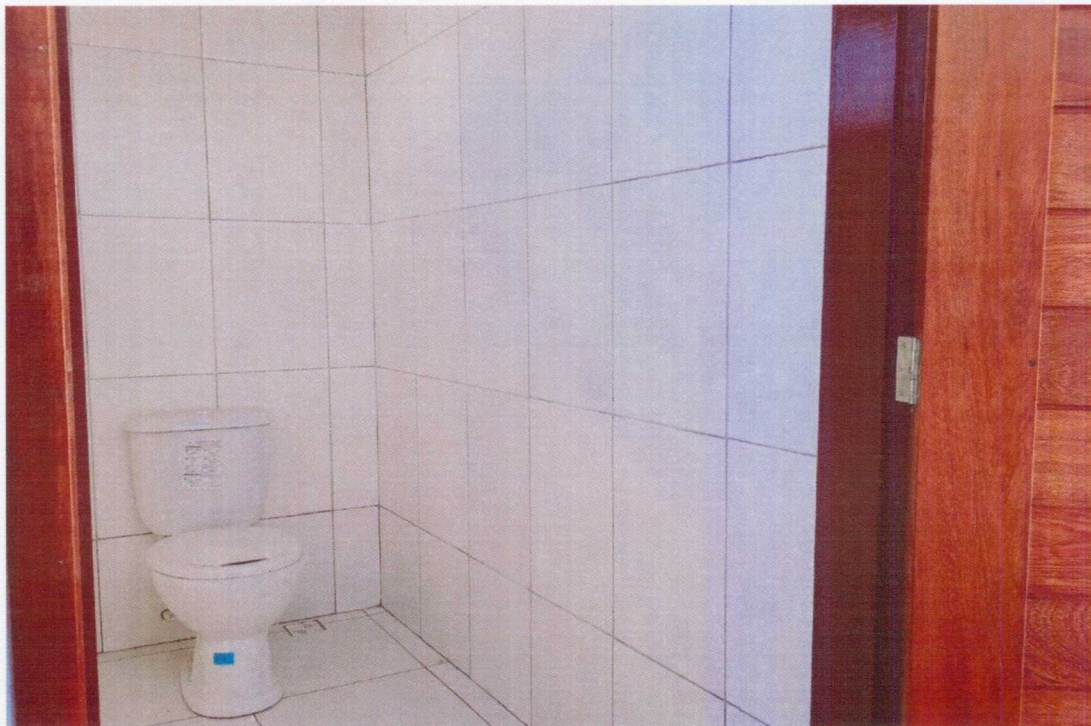


Foto 06—Vista interna do quiosque

*[Handwritten signatures]*





Foto 07– Vista do alambrado e arquibancada



Foto 08– Vista do piso intertravado

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*
