



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
14/05/2024

Município Piraí do Norte	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Piraí do Norte	Responsável Ulysses Araújo de Menezes Veiga
Contato Verena Menezes Mamedio	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio de Futebol

Endereço
Sede do Município

Convênio 29/22	Processo 069.1486.2023.0000889-00	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 01/06/2022		Valor do Convênio 2.387.774,89	Valor da Parcela Vistoriada 653.218,29

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Piraí do Norte, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio de Futebol, município de Piraí do Norte, objeto do convênio nº 29/22 no valor de R\$ 2.387.774,89 (Dois milhões, trezentos e oitenta e sete mil setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) Obra segue em andamento.
Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.289,65	7.289,65	100,00%	21.868,96	14.579,30	66,67%
SERVIÇOS PRELIMINARES			0,00%	18.383,25	18.383,25	100,00%
RECUPERAÇÃO DO GRAMADO NATURAL	45.996,45		0,00%	112.307,65	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM	97.004,77		0,00%	323.283,44	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, TIPO C-4	89.180,32	255.450,35	286,44%	425.687,85	344.630,67	80,96%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA	42.980,99		0,00%	128.942,97	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE 02 ARQUIBANCADAS	163.799,57	163.799,57	100,00%	491.398,70	327.599,14	66,67%
BANCOS DE RESERVAS	15.815,63		0,00%	31.631,25	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE MURO NO ENTORNO	105.934,61	105.934,61	100,00%	368.529,86	211.869,22	57,49%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO	65.095,66	41.550,45	63,83%	195.286,97	106.646,11	54,61%
PAVIMENTAÇÃO NOS ACESSOS	20.120,64	-	0,00%	60.361,91	20.120,64	33,33%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL			0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
DRENAGEM DO CAMPO ESP DE PEIXE				72.342,76		
SISTEMA DE DRENAGEM EXTERNO				42.833,12		
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE CAMPO				83.041,22		
TOTAL	653.218,29	574.024,63	87,87%	2.387.774,89	1.043.828,33	43,71%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 29/22, no valor de R\$ 653.218,29 (Seiscentos e cinquenta e três mil, duzentos e dezoito reais e vinte e nove centavos).

Responsável Claudio Jorge Figueiredo Bragança	Cargo / ANALISTA TECNICO.	Data do Relatório 15/05/2024
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras / SUDESB
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

Claudio Jorge Figueiredo Bragança
Analista Técnico Nivel B
Projeto FLEM/SUDESB

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio de Futebol, Município de Pirai do Norte, Convênio 29/22.

FOTO 01 – PLACA DA OBRA


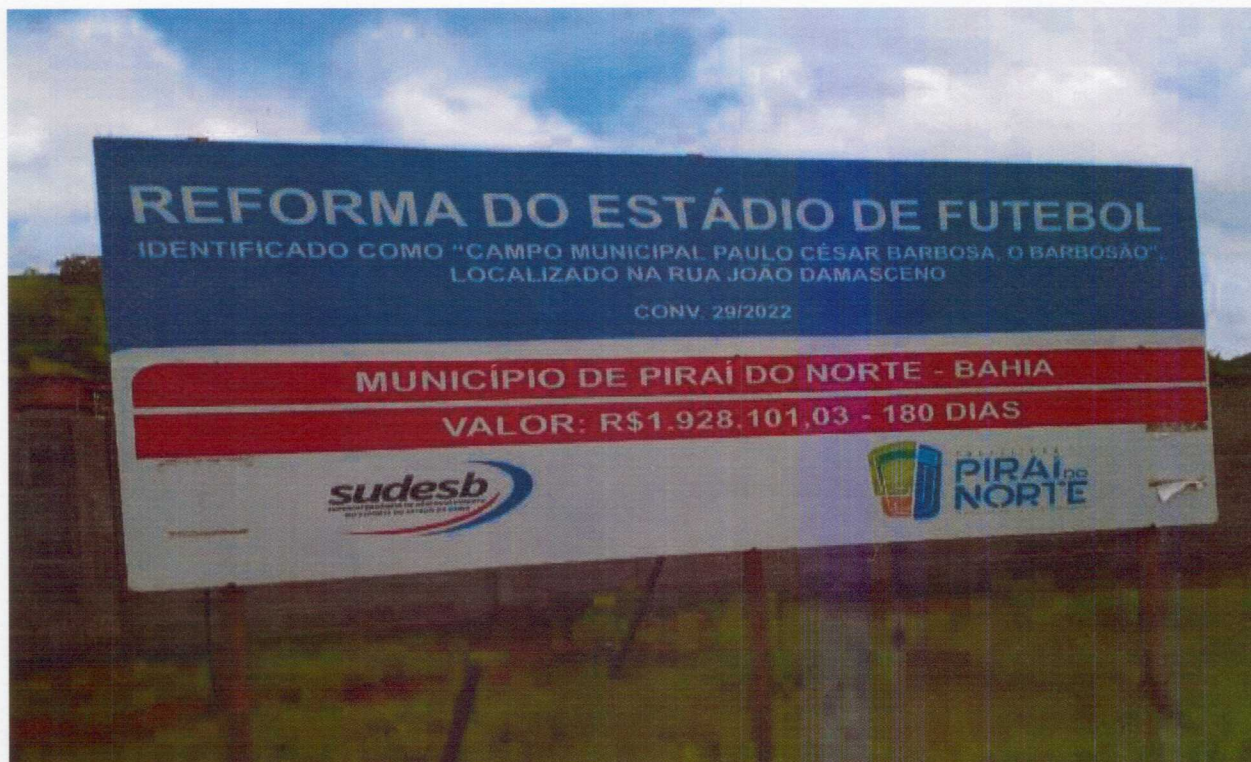


Foto 02 – VISTA DO VESTIÁRIO

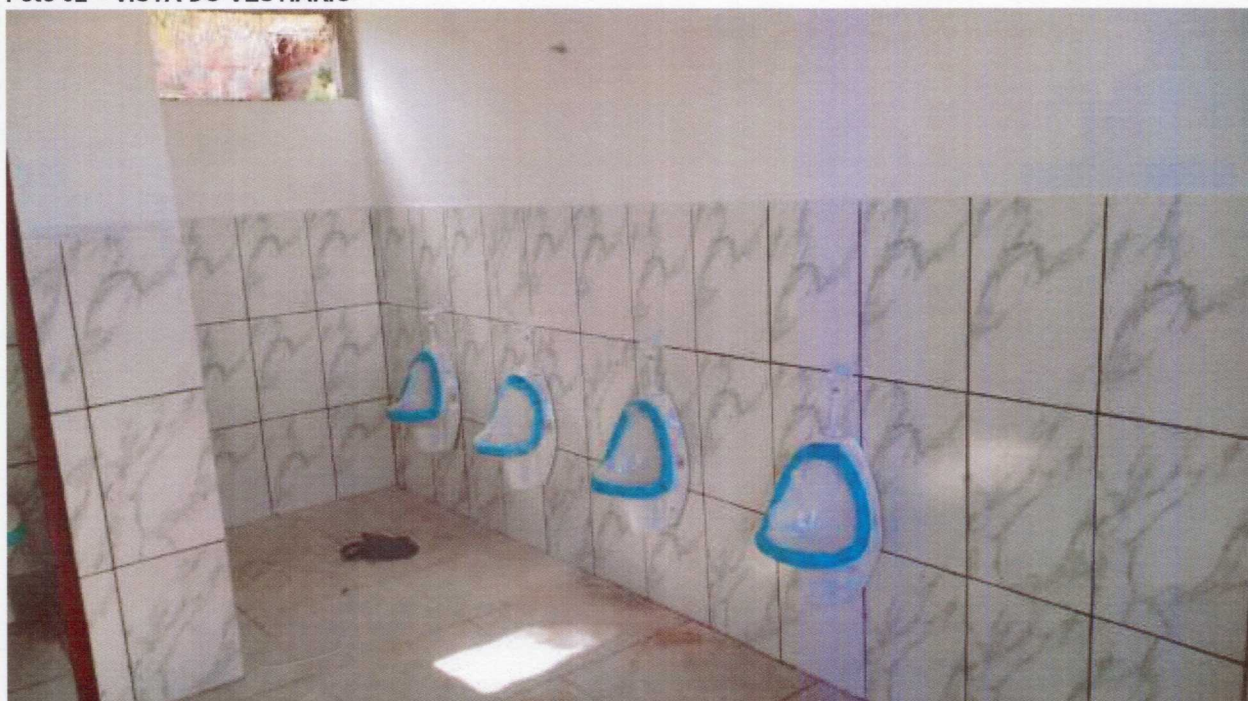

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio de Futebol, Município de Pirai do Norte, Convênio 29/22.

Foto 03 – VISTA DA COBERTURA DO SANITÁRIO EM ANDAMENTO



Foto 04 – VISTA DA FERRAGEM DA COBERTURA DA ARQUIBANCADA




IV

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio de Futebol, Município de Pirai do Norte, Convênio 29/22.

Foto 05 – VISTA DA FUNDAÇÃO DA COBERTURA DA ARQUIBANCADA



FOTO 06 – VISTA DA ENTRADA DO VESTIÁRIO

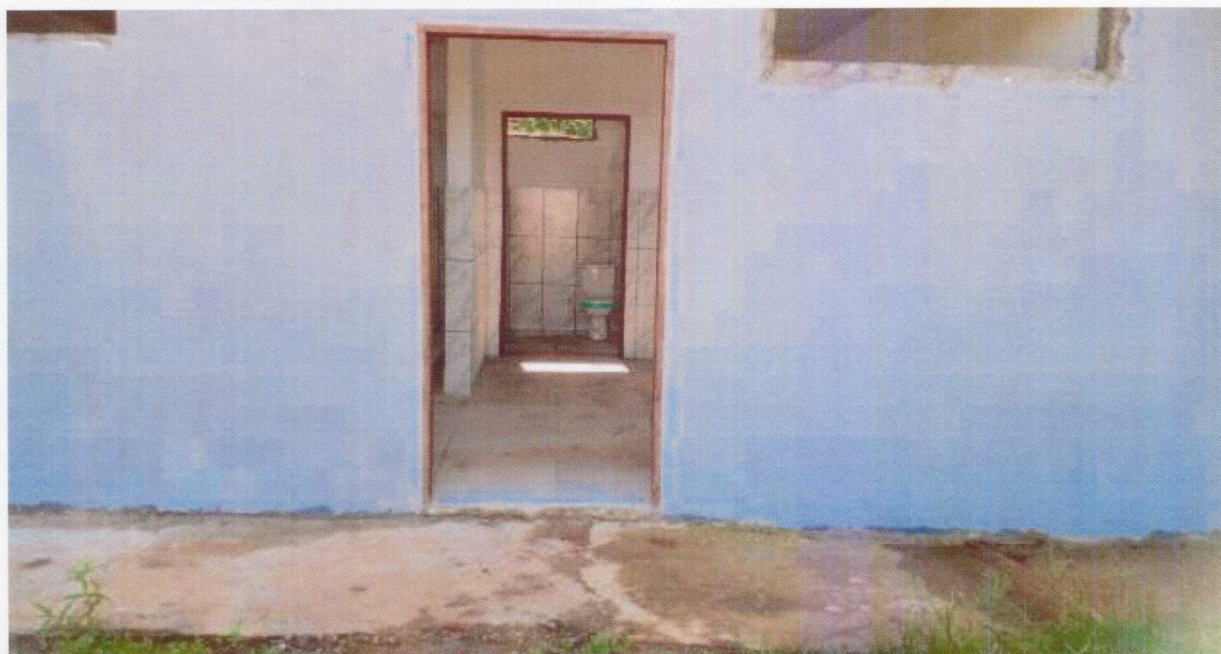

[Handwritten signature]
