



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/03

Data da Vistoria  
13/05/2024

<b>Município:</b> Tanquinho	<b>Assunto:</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado:</b> Prefeitura Municipal de Tanquinho	<b>Responsável:</b> José Luiz dos Santos Reis
<b>Contato:</b> Adriany Amoêdo	<b>Cargo:</b> Engenheiro
<b>Objeto:</b> Reforma do Estádio Municipal	
<b>Endereço:</b> Sede do Município	

<b>Convênio</b> 55/22	<b>Processo</b> 069.1479.2022.0001967-66	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 3º Vistoria da 2ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 20/05/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 1.102.829,82	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 305.395,15

**LAUDO TECNICO:**

Em visita ao Município de Tanquinho, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, município de Tanquinho, objeto do convênio nº 55/22 no valor de R\$ 1.102.829,82 (Um milhão cento e dois mil oitocentos vinte e nove reais e oitenta e dois centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.255,46	3.255,46	100,00%	9.766,38	6.510,92	66,67%
SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	0,00%	7.375,94	7.375,94	100,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	68933,71	0,00	0,00%	142.055,55	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, TIPO C-4	118151,18	118.151,18	100,00%	235.161,68	235.161,68	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 30,00M COM ACESSIBILIDADE	70.804,31	70.804,31	100,00%	177.010,78	140.014,97	79,10%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO	44.250,49	40.250,49	90,96%	190.232,51	173.001,98	90,94%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00%	31.631,25	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO NOS ACESSOS PRINCIPAIS (PISO INTERTRAVADO)	0,00	0,00	0,00%	68.811,39	0,00	0,00%
Reforma do Muro	0,00	0,00	0,00%	49.936,26	0,00	0,00%
Fechamento do Campo	0,00	0,00	0,00%	41.604,34	0,00	0,00%
Recuperação da arquibancada existente	0,00	0,00	0,00%	39.794,57	0,00	0,00%
Reforma da Bilheteria	0,00	0,00	0,00%	14.041,34	0,00	0,00%
Ampliação do Vestiário Tipo 4	0,00	0,00	0,00%	83.532,83	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>305.395,15</b>	<b>232.461,44</b>	<b>76,12%</b>	<b>1.102.829,82</b>	<b>562.065,49</b>	<b>50,97%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 55/22, no valor de R\$ 305.395,15 (trezentos e cinco mil e trezentos e noventa e cinco reais e quinze centavos).

<b>Responsável:</b> Carlos A. C. Oliveira.	<b>Cargo / ANALISTA TECNICO.</b>	<b>Data do Relatório</b>
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes.	<b>Cargo / CREA/Cadastro:</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>14/05/2024</b>

*Carlos Antonio Carvalho de Oliveira*  
Analista Técnico Nível B  
Projeto FLEM/SUDES B

*Luiz Antonio Almeida Brantes*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras / SUDES B  
Cad. 69520107-9  
CAU A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Tanquinho, Convênio 55/22.

Foto 01 – Execução do Sanitário público, área interna.



Foto 02 – Execução do Sanitário Público Area Externa.




*[Handwritten signature]*

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Tanquinho, Convênio 55/22.

FOTO 03 – Area Interna do vestiário.



Foto 04 – Execução da arquibancada com cinco degraus.

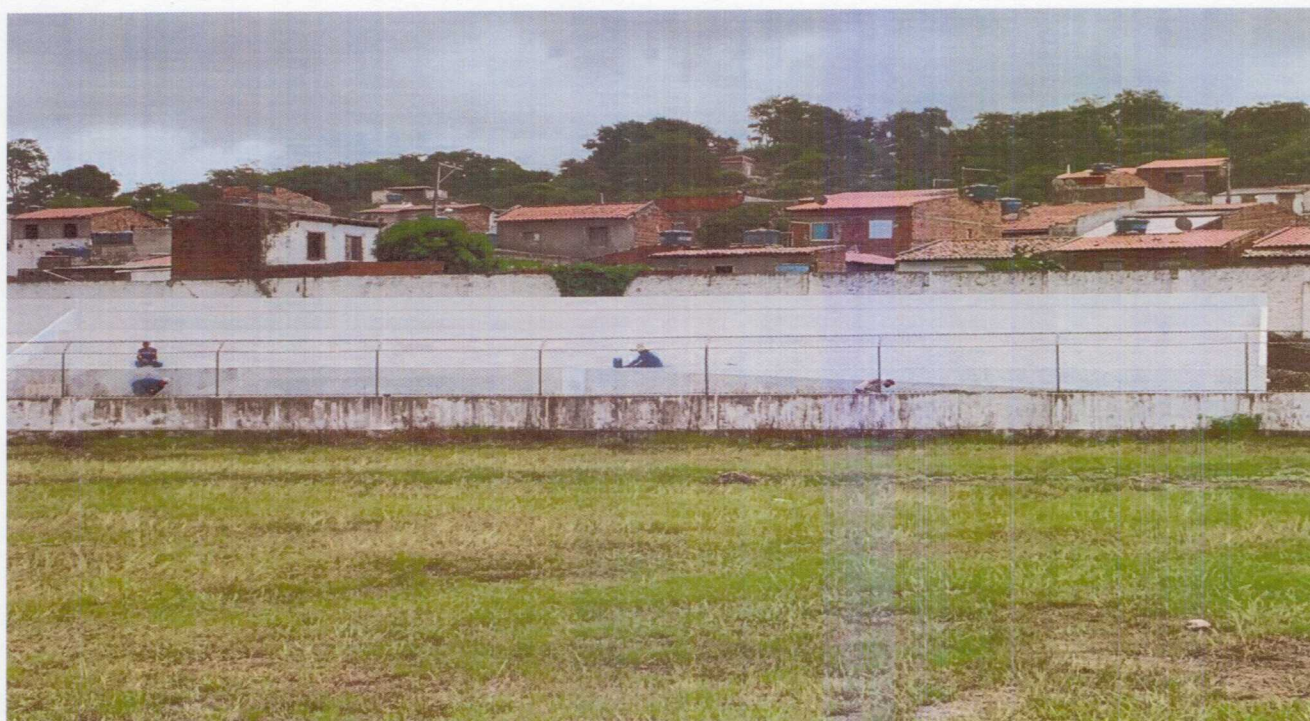

*[Handwritten signature]*

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Tanquinho, Convênio 55/22.

Foto 05 — Area interna do vestiário.



Foto 06 — Area interna do vestiário.



*esaf*
