



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/03

Data da Vistoria
17/05/2024

Município Miguel Calmon	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Miguel Calmon	Responsável José Ricardo Leal Requião
Contato José Mario Pereira Queiroz	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção de pista de caminhada no entorno do campo do Estádio João Liberato

Endereço
Sede do Município

Convênio 35/22	Processo 069.1486.2022.0004832-63	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 4º Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 14/05/2022		Valor do Convênio R\$ 618.652,32	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 281.862,94

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Miguel Calmon, onde foi vistoriada a obra de Construção de pista de caminhada no entorno do campo do Estádio João Liberato, município de Miguel Calmon, objeto do convênio nº 35/22 no valor de R\$ 618.652,32 (seiscentos e dezoito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	19.547,44	19.547,44	100,00%	39.094,88	39.094,88	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES				80.428,48	80.428,48	100,00%
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA	250.440,50	230.440,50	92,01%	487.253,96	467.253,96	95,90%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL	11.875,00	11.875,00	100,00%	11.875,00	11.875,00	100,00%
TOTAL	281.862,94	261.862,94	92,90%	618.652,32	598.652,32	96,77%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 35/22, no valor de R\$ 281.862,94 (duzentos e oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

OBS: Devido às chuvas a pista vai precisar de reparos.

Responsável Carlos A.C. de Oliveira	Cargo: Analista Técnico.	Data do Relatório 20/05/2024
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes.	Cargo / CREA/Cadastro: Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Carlos Antonio Carvalho de Oliveira
Analista Técnico Nivel B
Projeto FLEM/SUDESB


Luiz Antonio Almeida Brantes
Coordenador de Obras / SUDESB
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

Relatório Fotográfico da Construção de pista de caminhada no entorno do campo do Estádio João Liberato, Município de Miguel Calmon, Convênio 35/22.

Foto 01 – Vista da pista.



Foto 02 – lateral da pista.

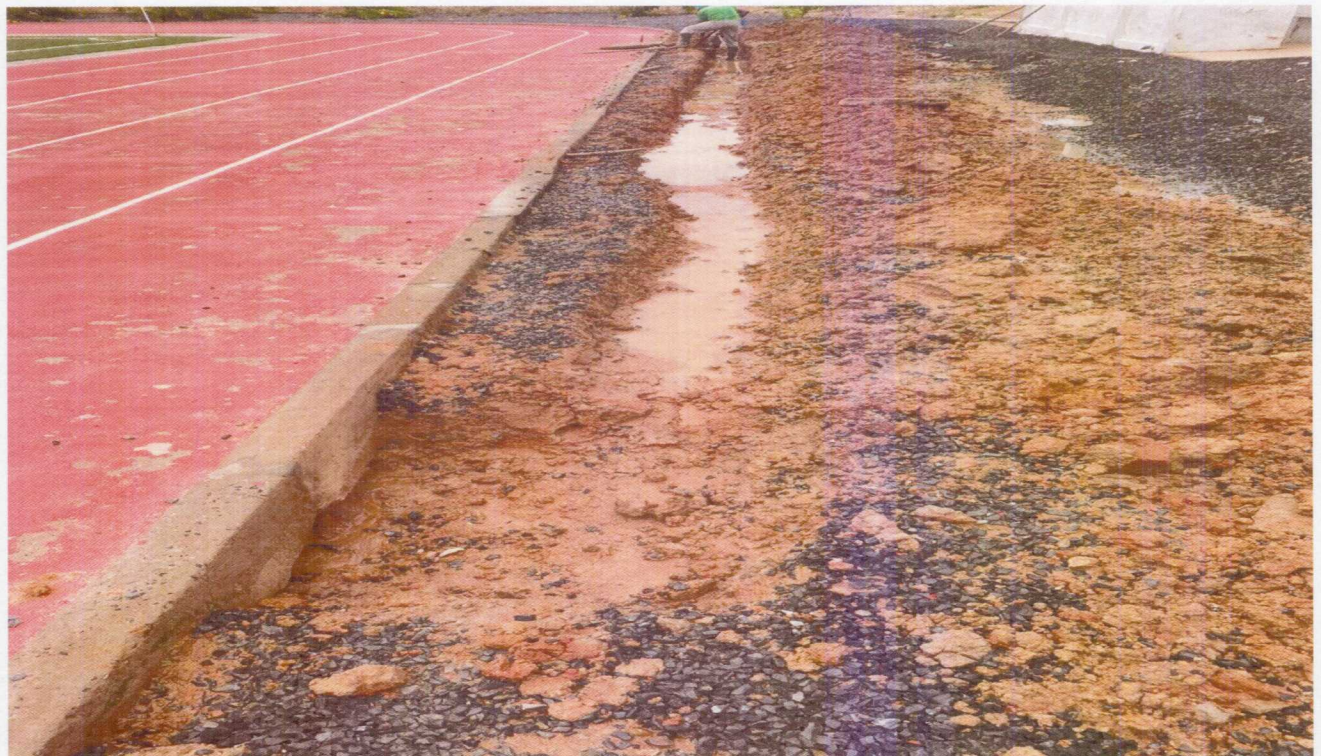

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico da Construção de pista de caminhada no entorno do campo do Estádio João Liberato, Município de Miguel Calmon, Convênio 35/22.

Foto 3 – lateral da pista .



FOTO 4 – TOTEM.

