



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/06

Data da Vistoria
22/MAIO/2024

Município Nordestina	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Nordestina	Responsável Eliete de Andrade Araujo
Contato Juarez Cardoso Neves	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal

Endereço
Sede do Município

Convênio 49/22	Processo 069.1475.2022.0001902-97 069.1474.2023.0005945-88	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 5ª Vistoria da 2ª Parcela
--------------------------	---	------------------------------------	--

Publicação no D.O.E 18/05/2022 e 21/12/2023	Valor do Convênio R\$ 1.657.926,88	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 390.762,11
---	--	--

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Nordestina, onde foi vistoriada a obra Reforma do Estádio Municipal, município de Nordestina, objeto do convênio nº 49/22 no valor de R\$ 1.657.926,88 (um milhão seiscentos e cinquenta e sete mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.455,06	3.455,06	100,00%	10.365,20	6.910,12	66,67%
SERVIÇOS PRELIMINARES				18.486,82	18.486,82	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NATURAL COM IRRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR E OSMOSE REVERSA	103.133,02	103.133,02	100,00%	772.614,15	103.133,02	13,35%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 30M	42.477,79	42.477,79	100,00%	84.955,59	74.351,05	87,52%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, TIPO C-4	89.164,99	89.164,99	100,00%	267.494,96	230.329,98	86,11%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	42.531,62	42.531,62	100,00%	127.594,86	102.448,40	80,29%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO	65.514,62	65.514,62	100,00%	196.543,86	145.628,87	74,09%
COMPLEMENTAÇÃO DO MURO DE ENTORNO	44.485,00	44.485,00	100,00%	88.970,00	88.970,00	100,00%
PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS PRINCIPAIS	0,00	0,00	0,00%	79.026,44	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	390.762,11	390.762,11	100,00%	1.657.926,88	770.258,26	46,46%

Nota:

- Firmado e Publicado o 4º Termo Aditivo ao Convênio 49/22, conforme processo SEI nº 069.1486.2023.0005945-88, publicado no Diário Oficial de 21 Dez. 2023, Valor Acrescido a 3ª parcela R\$ 463.215,09 (quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e quinze reais e nove centavos), para custear a implantação da Osmose Reversa.
- O valor percentual total do item Implantação de gramado foi alterado em função do acréscimo correspondente ao aditivo.

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 49/22, no valor de R\$ 390.762,11 (trezentos e noventa mil setecentos e sessenta e dois reais e onze centavos).

Técnico responsável pela Vistoria. Abraão Rodrigues da Silva Analista Técnico N-8 Projeto FLEM/SUDESB		Data do Relatório 22 de Maio de 2024.
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras / SUDESB
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Nordestina, Convênio 49/22.

Foto 01 – Vista da atual entrada do Estádio – Recuperação de reboco e piso cimentado.



Foto 02 – Vista interna dos vestiário – Instalações elétricas e bancadas.



[Handwritten signatures]

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Nordestina, Convênio 49/22.

Foto 03 – Vista Interna dos sanitários – Instalação de forro.

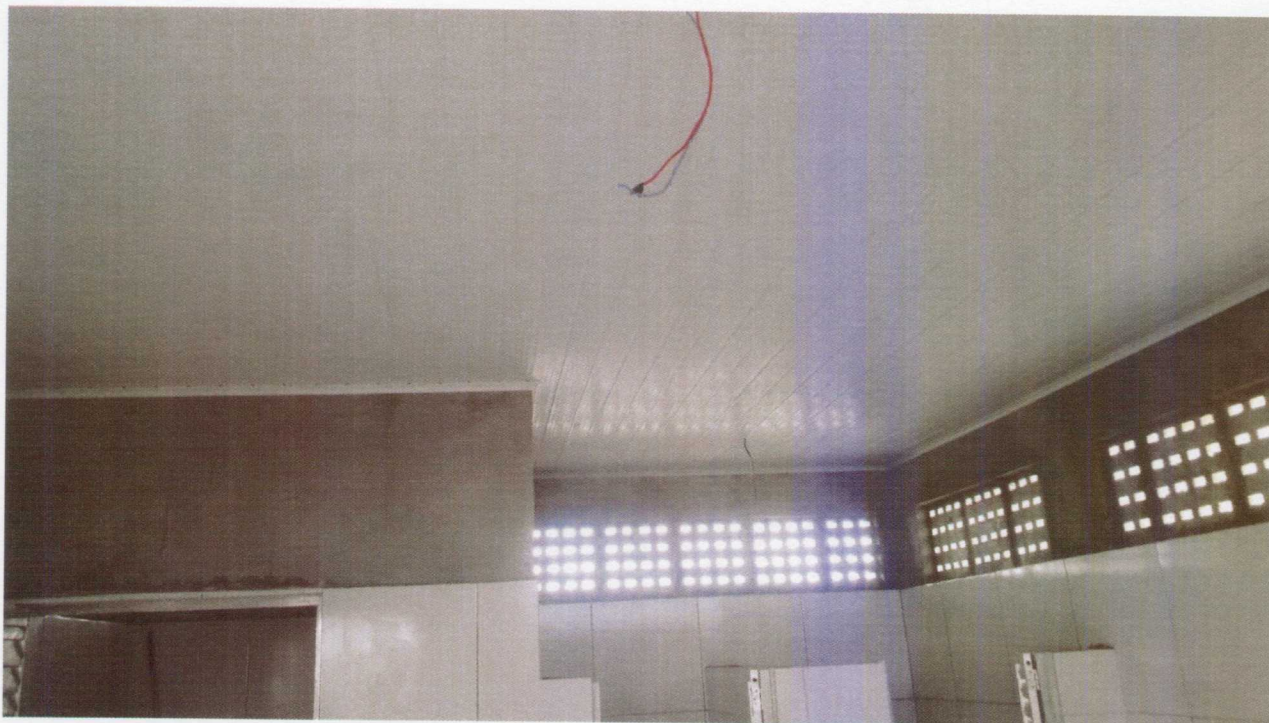


Foto 04 – Vista externa do Sanitário Público.



[Handwritten signatures]

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Nordestina, Convênio 49/22.

Foto 05 – Vista Interna do Sanitário Público - Instalação de louças.



Foto 06 – Vista da Arquibancada e Postes do sistema de iluminação – Instalação de guarda corpo.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Nordestina, Convênio 49/22.

Foto 07 – Vista do Sistema de irrigação – instalação de redes e bomba.



Foto 08 – Vista do Sistema de irrigação – instalação de redes e bomba e poço profundo.



Foto 09 – Vista do muro externo – Recuperação de reboco e alvenaria.

[Handwritten signatures]

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Nordestina, Convênio 49/22.



①
