



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/04

Data da Vistoria
02/05/2024

Município Jacobina	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Jacobina	Responsável Tiago Manoel Dias Ferreira
Contato Eduardo Fernandes	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal José Rocha,

Endereço
Sede do Município

Convênio 17/22	Processo 069.1479.2022.0000582-91	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 7º Vistoria da 3ª Parcela
Publicação no D.O.E 09/04/2022		Valor do Convênio R\$ 1.598.693,15	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 421.158,50

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Jacobina, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal José Rocha, município de Jacobina, objeto do convênio nº 17/22 no valor de R\$ 1.598.693,15 (um milhão quinhentos e noventa e oito mil seiscentos e noventa e três reais e quinze centavos).
Obs.obra encontra-se paralisada devido as constantes chuvas no município, Pista de atletismo falta os seguintes serviços. Aplicação do selador, aplicação de RR2C, segunda camada de brita, rolo para acomodar e selar e aplicação do diluido, gramado falta a instalação dos aspessores.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20.234,85	10.000,00	49,42%	40.672,19	38.037,34	93,52%
SERVIÇOS PRELIMINARES	148,39	148,39	100,00%	2.366,71	2.366,71	100,00%
REVESTIMENTO			0,00%	182.529,38	182.529,38	100,00%
ESQUADRIAS			0,00%	51.649,44	51.649,44	100,00%
COBERTURA			0,00%	147.026,52	147.026,52	100,00%
PINTURA GERAL	77.372,89	77.372,89	100,00%	232.118,67	232.118,67	100,00%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			0,00%	22.038,58	22.038,58	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	180888,62	180.888,62	100,00%	542.665,86	542.665,86	100,00%
PISTA DE CORRIDA	11118,21		0,00%	156.589,41	145.471,20	92,90%
DRENAGEM DO VESTIÁRIO	6041,14	6.041,14	100,00%	12.082,27	12.082,27	100,00%
MANUTENÇÃO DO GRAMADO	83554,53	75.000,00	89,76%	83.554,53	75.000,00	89,76%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	41799,86	1.799,86	4,31%	125.399,59	85.377,59	68,08%
TOTAL	421.158,50	351.250,90	83,40%	1.598.693,15	1.536.363,56	96,10%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 3ª parcela do convênio nº 17/22, no valor de R\$ 421.158,50 (quatrocentos e vinte e um mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).

Responsável : Othon Batista	Cargo / Analista técnico.	Data do Relatório 08/05/2024
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro/Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Othon Batista dos Santos
Analista Técnico Nivel B
Projeto FLEM/SUDES B


Luiz Antonio Almeida Brantes
Coordenador de Obras / SUDES B
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Rocha, Município de Jacobina, Convênio 17/22.

FOTO 01 -Vista da pista de atletismo.



FOTO 02 – Vista da pista de atletismo

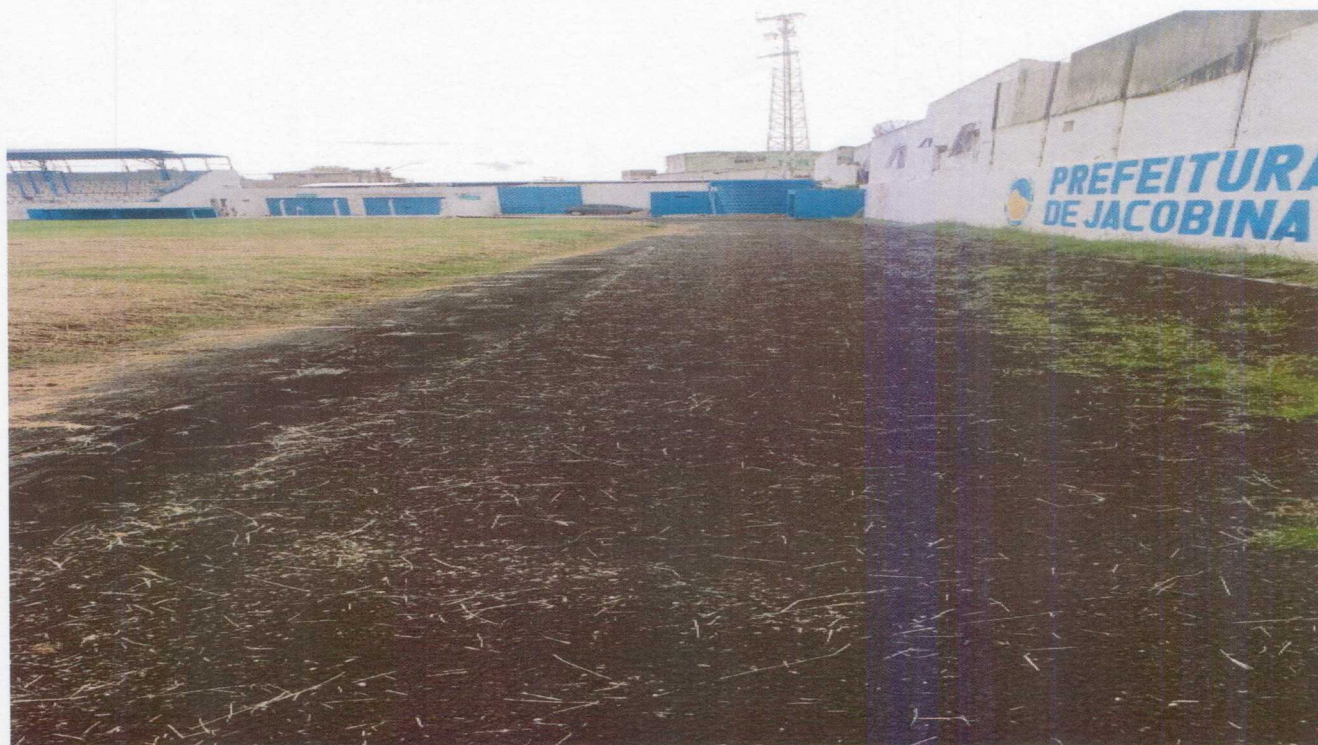

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Rocha, Município de Jacobina, Convênio 17/22.

FOTO 03 – Vista geral do gramado.



[Handwritten signature in blue ink]
