



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
26/10/2023

<b>Município</b> Aracatu	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Aracatu	<b>Responsável</b> Braulina Lima Silva
<b>Contato</b> Klecio Larry Teixeira Correia	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Reforma do Estádio Municipal Libério Alves Maia

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 17/21	<b>Processo</b> 069.1479.2021.0003639-12	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1ª Vistoria da 2ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 09/04/2022		<b>Valor do Convênio</b> 698.495,81	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> 337.017,11

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Aracatu, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Libério Alves Maia, município de Aracatu, objeto do convênio nº 17/21 no valor de R\$ 698.495,81 (seiscentos e noventa e oito mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos) foi constatado que a obra está em andamento.  
Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	17.756,03	13.025,63	73,36%	35.512,06	30.781,66	86,68%
INSTALAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS	-	-		38.825,18	38.825,18	100,00%
TERRAPLANAGEM	-	-		19.187,35	19.187,35	100,00%
VESTIÁRIO E LANCHONETE	87.640,22	75.362,21	85,99%	219.371,87	151.227,86	68,94%
CAMPO	33.950,17	31.235,86	92,01%	187.928,67	185.214,36	98,56%
INFRAESTRURA	161.428,24	27.227,61	16,87%	161.428,24	19.324,97	11,97%
PINTURA DO MURO (INTENO E EXTERNO)	19.324,97	2.732,98	70,91%	19.324,97	2.732,98	14,14%
PINTURA DA ARQUIBANCADA	13.063,13	0,00	0,00%	13.063,13	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	3.854,34	2.983,10	77,40%	3.854,34	2.983,10	77,40%
<b>TOTAL</b>	<b>337.017,11</b>	<b>152.567,39</b>	<b>45,27%</b>	<b>698.495,81</b>	<b>447.294,36</b>	<b>64,04%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 17/21, no valor de R\$ 337.017,11 (trezentos e trinta e sete mil, dezessete reais e onze centavos).

<b>Responsável</b> Nelson Rocha	 Engenheiro Civil / SUDESB CAD: 92085362 CREA-BA: 3000077244	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Analista Técnico	<b>Data do Relatório</b> 17/11/2023
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	 Luiz Antonio Brantes Coordenador de Obras / SUDESB Cad. 69520107-9 CAU A-12275-0	Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	



Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Libério Alves Maia, Município de Aracatu, Convênio 17/21.

FOTO 01: Vista geral do Alambrado



FOTO 02: Vista do intertravado




*[Handwritten signatures]*



Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Libério Alves Maia, Município de Aracatu, Convênio 17/21.

Vista Interna do Vestiário

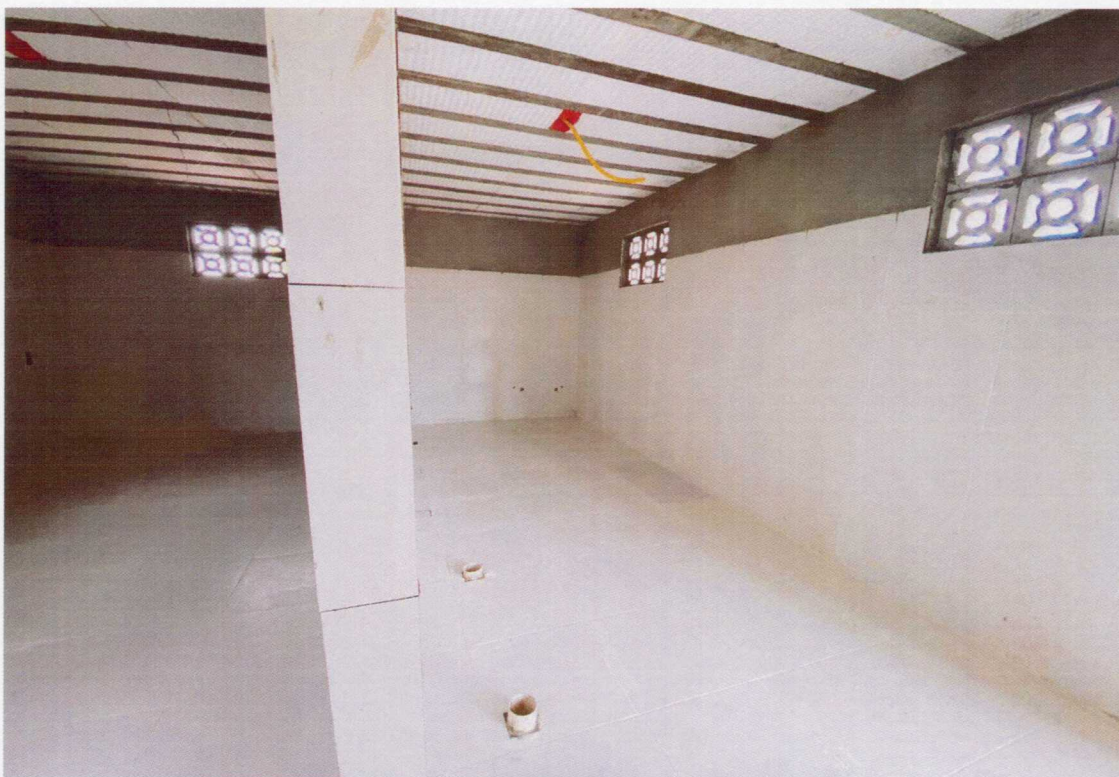

**Nelson Rocha**  
Engenheiro Civil / SUDESB  
CAD: 92085362  
CREA-BA: 3000077244

**Luiz Antonio B. antes**  
Coordenador de Obras / SUDESB  
Cad. 69520107-9  
CAU A-12275-0
