



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO.  
**RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO**

FLS. 01/03

Data da Vistoria  
25/JAN/2024

<b>Município</b> Aratuípe	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Aratuípe	<b>Responsável</b> Antônio Marcos Araújo de Souza
<b>Contato</b> Gabriel Coelho Andrade	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Reforma do Estádio Municipal Rosival da Silva Leão

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 24/21	<b>Processo</b> 069.1486.2022.0003519-44	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 5ª Vistoria da 2ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 30/12/2021		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 1.297.293,27	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 378.815,38

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Aratuípe, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Rosival da Silva Leão, município de Aratuípe, objeto do convênio nº 24/21 no valor de R\$ 1.297.293,27 (um milhão e duzentos e noventa e sete mil e duzentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.733,41	6.733,41	100,00%	20.200,24	13.466,82	13,466,82
SERVIÇOS PRELIMINARES			0,00%	5.519,64	5.519,64	100,00%
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ENTORNO	94.559,81	94.559,81	100,00%	438.233,70	204.118,24	46,58%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO AO REDOR DO CAMPO	59.830,35	56.838,83	95,00%	269.205,40	146.573,96	54,45%
RECUPERAÇÃO DE ARQUIBANCADA EXISTENTE	23.499,64	23.499,64	100,00%	70.489,91	46.996,28	66,67%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO	77.342,02	73.474,92	95,00%	161.802,61	93.214,47	57,61%
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES	42.158,17	40.158,17	95,26%	84.316,34	82.316,34	97,63%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50.795,94		0,00%	101.591,88	16.931,98	16,67%
PAVIMENTAÇÃO			0,00%	96.709,62	96.709,62	100,00%
PAISAGISMO	20.841,96		0,00%	34.736,60	13.894,64	40,00%
EQUIPAMENTOS	3.054,08		0,00%	3.054,08	0,00	0,00%
TOTEM INSTITUCIONAL			0,00%	11.433,25	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>378.815,38</b>	<b>295.264,78</b>	<b>77,94%</b>	<b>1.297.293,27</b>	<b>609.137,73</b>	<b>46,95%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 24/21, no valor de R\$ 378.815,38 (Trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e quinze reais e trinta e oito centavos).

<b>Responsável</b> João Fernando Neres da Cruz	João Fernando Neres da Cruz Analista Técnico Nível B Projeto FLEM/SUDES B	<b>Data do Relatório</b> 25/JAN/2024
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9 Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras / SUDES B  
Cad. 69520107-9  
CAU A-12275-0

**Foto 01** – Vista do vestiário.



**Foto 02** – Vista interna do vestiário em construção.




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Foto 03 – Vista do campo e quiosque.



Foto 04 – Vista interna do quiosque.

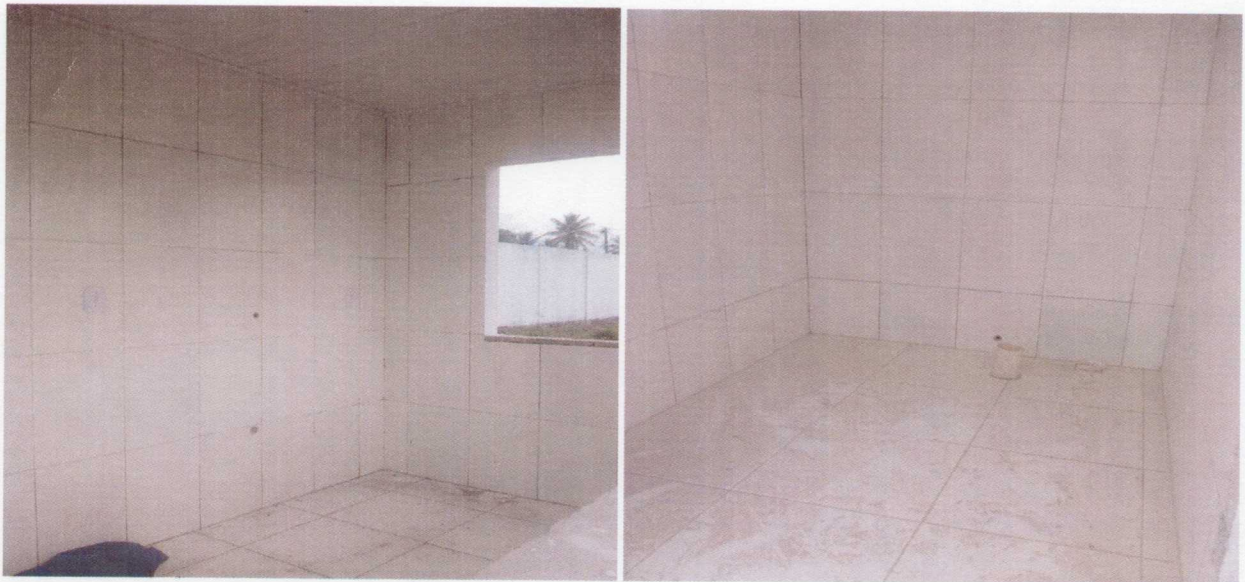

HR21

10



**SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA**  
**DIRETORIA DE OPERAÇÕES E ESPAÇOS ESPORTIVOS**  
**COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO**  
**NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO**

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Rosival da Silva Leão , Município de Aratuípe, Convênio 24/21.

Foto 05 – Vista frontal do campo.



121

P
