



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO.
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/04

Data da Vistoria
07/MAR/2024

Município Aratuípe	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Aratuípe	Responsável Antônio Marcos Araújo de Souza
Contato Gabriel Coelho Andrade	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal Rosival da Silva Leão

Endereço
Sede do Município

Convênio 24/21	Processo 069.1486.2022.0003519-44	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 6ª Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 30/12/2021		Valor do Convênio R\$ 1.297.293,27	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 378.815,38

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Aratuípe, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Rosival da Silva Leão, município de Aratuípe, objeto do convênio nº 24/21 no valor de R\$ 1.297.293,27 (Um milhão e duzentos e noventa e sete mil e duzentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.733,41	6.733,41	100,00%	20.200,24	13.466,82	66,67%
SERVIÇOS PRELIMINARES			0,00%	5.519,64	5.519,64	100,00%
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ENTORNO	94.559,81	175.118,89	185,19%	438.233,70	284.677,32	64,96%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO AO REDOR DO CAMPO	59.830,35	59.830,35	100,00%	269.205,40	269.205,39	100,00%
RECUPERAÇÃO DE ARQUIBANCADA EXISTENTE	23.499,64	23.499,64	100,00%	70.489,91	70.489,92	100,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO	77.342,02	73.474,92	100,00%	161.802,61	154.699,46	95,61%
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES	42.158,17	40.158,17	100,00%	84.316,34	82.316,34	97,63%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50.795,94		0,00%	101.591,88	16.931,98	16,67%
PAVIMENTAÇÃO			0,00%	96.709,62	96.709,62	100,00%
PAISAGISMO	20.841,96		0,00%	34.736,60	13.894,64	40,00%
EQUIPAMENTOS	3.054,08		0,00%	3.054,08	0,00	0,00%
TOTEM INSTITUCIONAL			0,00%	11.433,25	0,00	0,00%
TOTAL	378.815,38	378.815,38	100,00%	1.297.293,27	897.306,87	69,17%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como cumprida 2ª parcela do convênio nº 24/21, no valor de R\$ 378.815,38 (Trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e quinze reais e trinta e oito centavos).


Responsável João Fernando Neres da Cruz	<i>João Fernando Neres da Cruz</i> Analista Técnico Nível B Projeto FLEM/SUDES B	Data do Relatório 07/MAR/2024
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9 Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Almeida Brantes
Luiz Antonio Almeida Brantes
Coordenador de Obras / SUDES B
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

Foto 01 – Vista do vestiário.



Foto 02 – Vista interna do vestiário em construção.

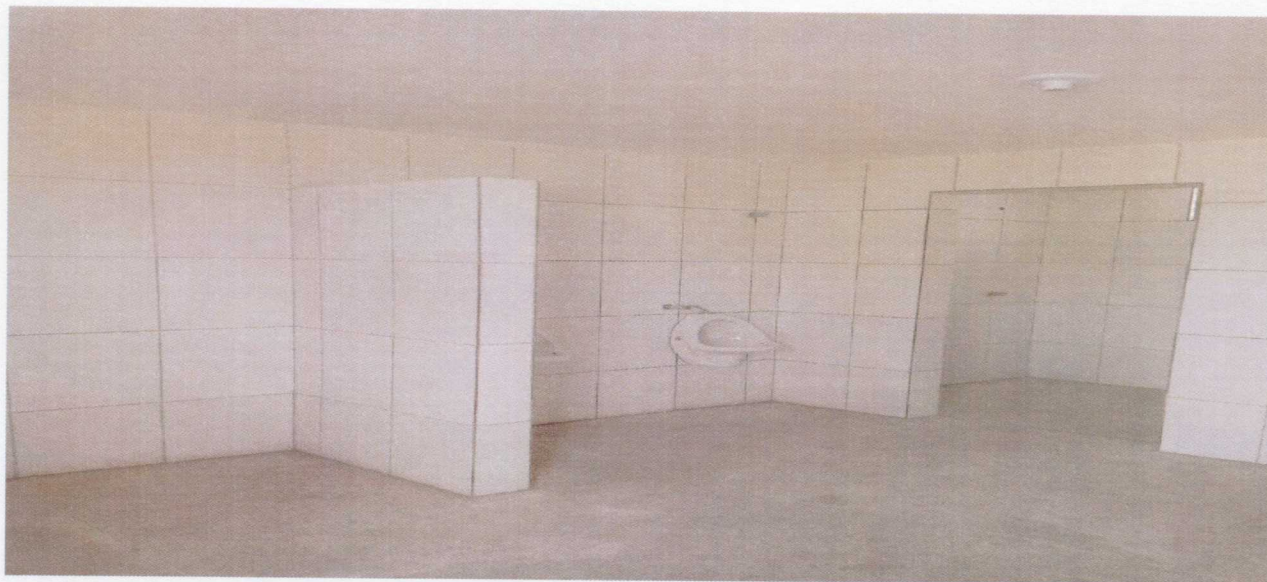

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Foto 03 – Vista do campo e quiosque.



Foto 04 – Vistas do quiosque.



AD

421



SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES E ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Rosival da Silva Leão , Município de Aratuípe, Convênio 24/21.

Foto 05 – Vista frontal do campo.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
