



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/03

Data da Vistoria  
31/10/2023

<b>Município</b> Ibicuí	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Ibicuí	<b>Responsável</b> Marcos Galvão de Assis
<b>Contato</b> Cleones Silva Matos	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Construção de Areninha Society

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 03/21	<b>Processo</b> 069.1479.2021.0002577-13	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 2ª Vistoria da 2ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 16/12/2021		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 923.784,00	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 295.754,87

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Ibicuí, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha Society, município de Ibicuí, objeto do convênio nº 03/21 no valor de R\$ 923.784,00 (novecentos e vinte e três mil e setecentos e oitenta e quatro reais) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.907,68	7.907,68	100,00%	23.723,04	15.815,36	66,67%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/0!	40.681,29	40.681,29	100,00%
INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NO CAMPO DE FUTEBOL 42X22M	73.656,00	73.656,00	100,00%	171.864,00	147.312,00	85,71%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 4,00M E REDE DE PROTEÇÃO	106.224,16	106.224,16	100,00%	265.560,39	265.560,39	100,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-3	107.967,04	107.967,04	100,00%	215.934,07	215.934,07	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 30M COM ACESSIBILIDADE			#DIV/0!	83.931,09	0,00	0,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED	0,00		0,00%	65.971,22	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO	0,00		0,00%	41.893,90	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	10.625,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	0,00	0,00	0,00%	3.600,00	0,00	0,00%
TOTAL	295.754,87	295.754,88	100,00%	923.784,00	685.303,11	74,18%

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 03/21, no valor de R\$ 295.754,87 (duzentos e noventa e cinco mil setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

<b>Responsável</b> Othon Batista	<b>Othon Batista dos Santos</b> Analista Técnico Nível B Projeto FLEM/SUDESB	<b>Cargo / Técnico Analista</b> Mat.12312	<b>Data do Relatório</b> 31/10/2023
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9		

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha Society, Município de Ibicuí, Convênio 03/21.

Foto 01 – Vista da execução do Alambrado.



Foto 02 – Vista da execução dos vestiários.



Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pituáçu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090  
Tel.: (71) 3198-0500 Site: [www.sudesb.ba.gov.br](http://www.sudesb.ba.gov.br)

*(Handwritten mark)*


*(Handwritten signature)*

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha Society, Município de Ibicuí, Convênio 03/21.

Foto 03 - Vista do gramado sintética;



Foto 04 – Vista da arquibancada

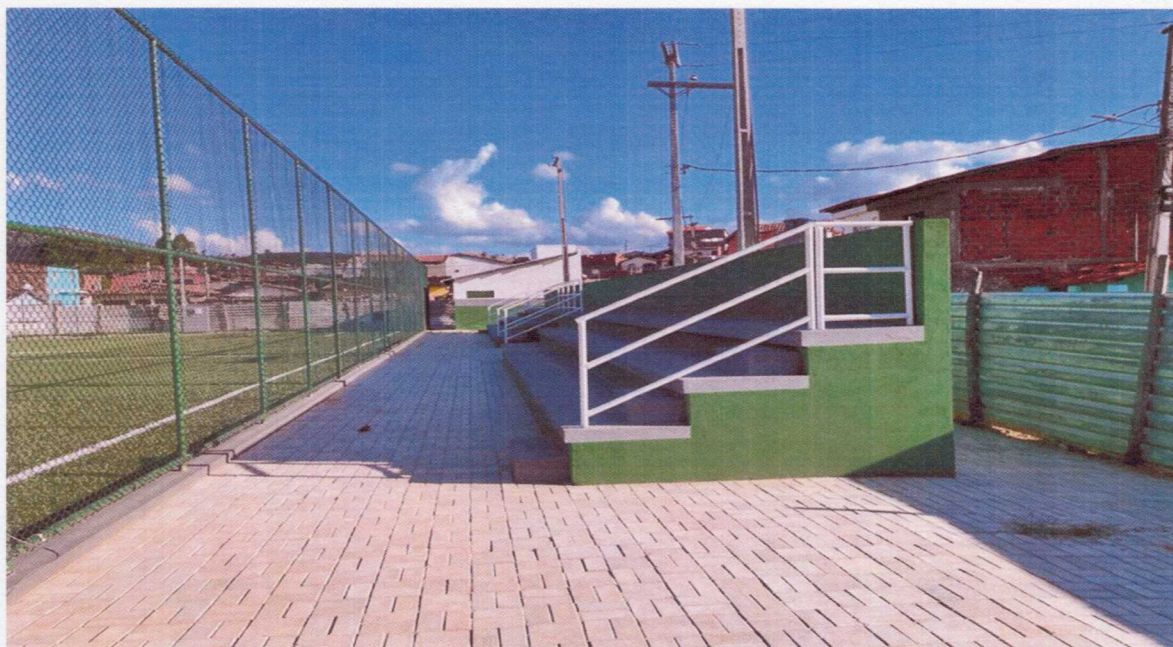

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*
