



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
27/03/2023

Município Nova Fátima	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Nova Fátima	Responsável José Adriano Santos Pereira
Contato Gerbes Barbosa Gomes	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal José Belzair dos Santos

Endereço
Sede do Município

Convênio 02/21	Processo 069.1479.2021.0001899-63	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 20/10/2021		Valor do Convênio 893.807,79	Valor da Parcela Vistoriada 446.903,90

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Nova Fátima, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal José Belzair dos Santos, município de Nova Fátima, objeto do convênio nº 02/21 no valor de R\$ 893.807,79 (oitocentos e noventa e três mil e oitocentos e sete reais e setenta e nove centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22.094,16	22.094,16	100,00%	44.188,32	44.188,32	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	-	9.814,67		9.814,67	9.814,67	100,00%
REFORMA DO ALAMBRADO EXISTENTE	83.756,95	83.756,95	100,00%	251.270,86	251.270,86	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 50M COM	124.176,20	124.176,20	100,00%	256.779,89	256.779,89	100,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	114.877,47	114.877,47	100,00%	229.754,93	229.754,93	100,00%
PAVIMENTAÇÃO	45620,14	45.620,14	100,00%	45.620,14	45.620,14	100,00%
BANCO DE RESERVAS	35625,00	35.625,00	0,00%	35.625,00	35.625,00	100,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	9629,98		0,00%	9.629,98	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	11124,00		0,00%	11.124,00	0,00	0,00%
TOTAL	446.903,90	435.964,59	97,55%	893.807,79	873.053,81	97,68%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 02/21, no valor de R\$ 446.903,90 (quatrocentos e quarenta e seis mil e novecentos e três reais e noventa centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes.	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 28/03/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes.		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N.º A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Belzair dos Santos, Município de Nova Fátima,
Convênio 02/21.**

Foto 01 – CONTUÇÃO DA ARQUIBANCADA E POSTE DE ILUMINAÇÃO



Foto 02 – PAVIMENTAÇÃO.




**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Belzair dos Santos, Município de Nova Fátima,
Convênio 02/21.**

FOTO 03 – ALAMBRADO.



FOTO 04 – FRENTE DO ESTÁDIO.

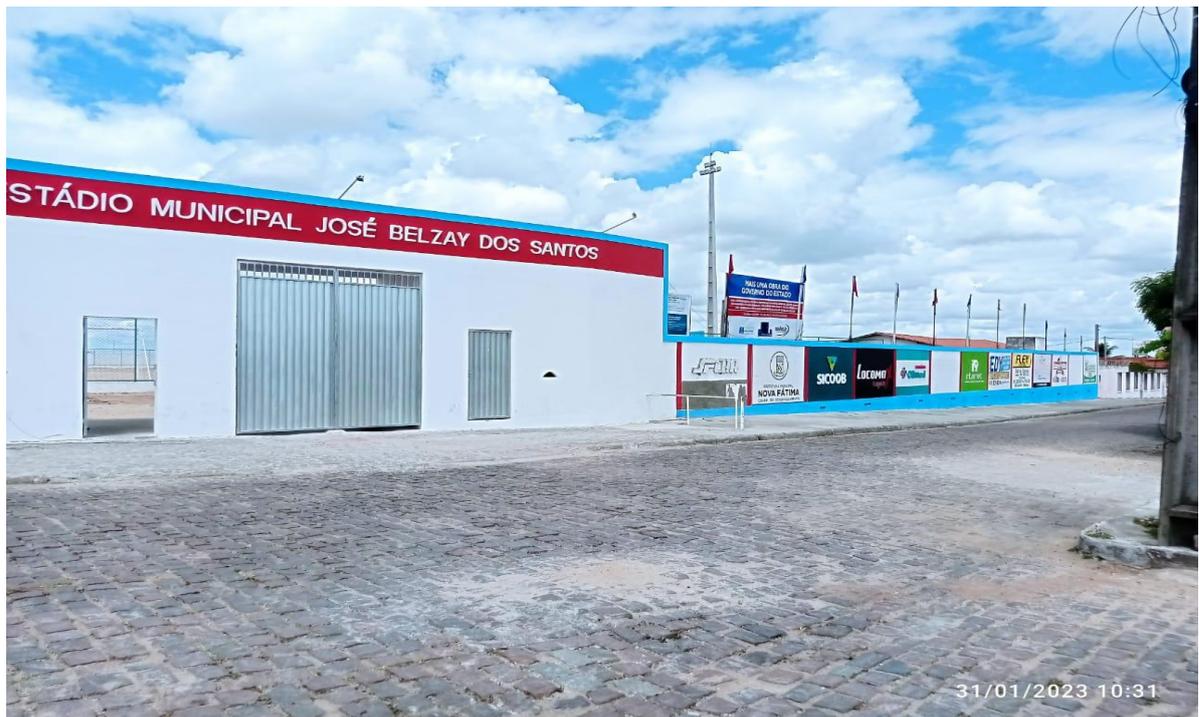

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Belzair dos Santos, Município de Nova Fátima,
Convênio 02/21.**

FOTO 05 e 06– BANCOS DE RESERVAS.

