


| | | |
|---|--|-------------------------------|
|  | SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO | FLS. 01/03 |
| | | Data da Vistoria 24/OUT/23 |

| | |
|--|--|
| Município Nordestina | Assunto Vistoria de Convênio |
| Interessado Prefeitura Municipal de Nordestina | Responsável Eliete de Andrade Araujo |
| Contato Juarez Cardoso Neves | Cargo Engenheiro |

Objeto
Reforma do Estádio Municipal

Endereço
Sede do Município

| | | | |
|--------------------------|---|------------------------------------|--|
| Convênio 49/22 | Processo 069.1475.2022.0001902-97 | Nº de Parcelas 03 (três) | Parcela Vistoriada 3º Vistoria da 2ª Parcela |
|--------------------------|---|------------------------------------|--|


| | | |
|--|--|--|
| Publicação no D.O.E 18/05/2022 | Valor do Convênio R\$ 1.194.711,79 | Valor da Parcela Vistoriada R\$ 390.762,11 |
|--|--|--|

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Nordestina, onde foi vistoriada a obra Reforma do Estádio Municipal, município de Nordestina, objeto do convênio nº 49/22 no valor de R\$ 1.194.711,79 (um milhão e cento e noventa e quatro mil e setecentos e onze reais e setenta e nove centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.
Segue abaixo a planilha dos serviços:

| SERVIÇOS | 2ª PARCELA | | | CONVÊNIO | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | Valor Parc. | Valor Exec. | Perc. (%) | Valor Total | Valor Exec. | Porc. (%) |
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 3.455,06 | 3.455,06 | 100,00% | 10.365,20 | 6.910,12 | 66,67% |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | #DIV/0! | 18.486,82 | 18.486,82 | 100,00% |
| IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NATURAL COM IRRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | 103.133,02 | 23.294,00 | 22,59% | 309.399,06 | 23.294,00 | 7,53% |
| CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 30M | 42.477,79 | 12.129,40 | 28,55% | 84.955,59 | 74.351,05 | 87,52% |
| CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, TIPO C-4 | 89.164,99 | 133.384,94 | 149,59% | 267.494,96 | 230.329,98 | 86,11% |
| IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL | 42.531,62 | 51.224,20 | 120,44% | 127.594,86 | 102.448,40 | 80,29% |
| CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO | 65.514,62 | 101.982,20 | 155,66% | 196.543,86 | 145.628,87 | 74,09% |
| COMPLEMENTAÇÃO DO MURO DE ENTORNO | 44.485,00 | 40.485,00 | 91,01% | 88.970,00 | 88.970,00 | 100,00% |
| PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS PRINCIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 79.026,44 | 0,00 | 0,00% |
| INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 11.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 390.762,11 | 365.954,80 | 93,65% | 1.194.711,79 | 690.419,24 | 57,79% |

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 49/22, no valor de R\$ 390.762,11 (trezentos e noventa mil setecentos e sessenta e dois reais e onze centavos).

| | | |
|--|---|---|
| Responsável Manuel Benedito Bispo Ramos | Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9 | Data do Relatório 24/OUT/23 |
| Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes | | |


 Manuel Benedito Bispo Ramos
 Especialista Técnico Nivel D
 Projeto PLEM/SUDES


 Luiz Antonio Brantes
 Coordenador de Obras
 Cad 69 520 107-9
 CAU Nº A: 12275-0

NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Nordestina, Convênio 49/22.

Foto 01 – Vista do muro em recuperação.



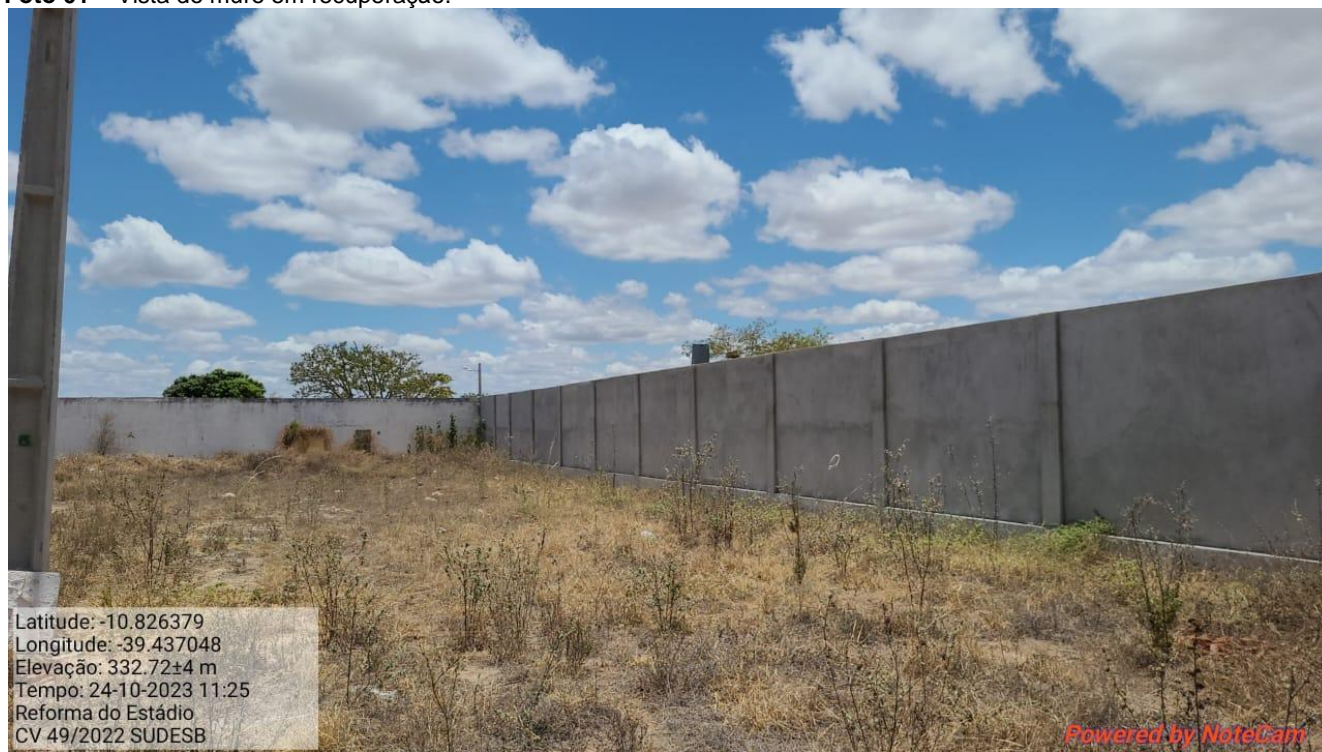


Foto 02 – Vista da recuperação do muro, dos postes instalados e do fundo da arquibancada.

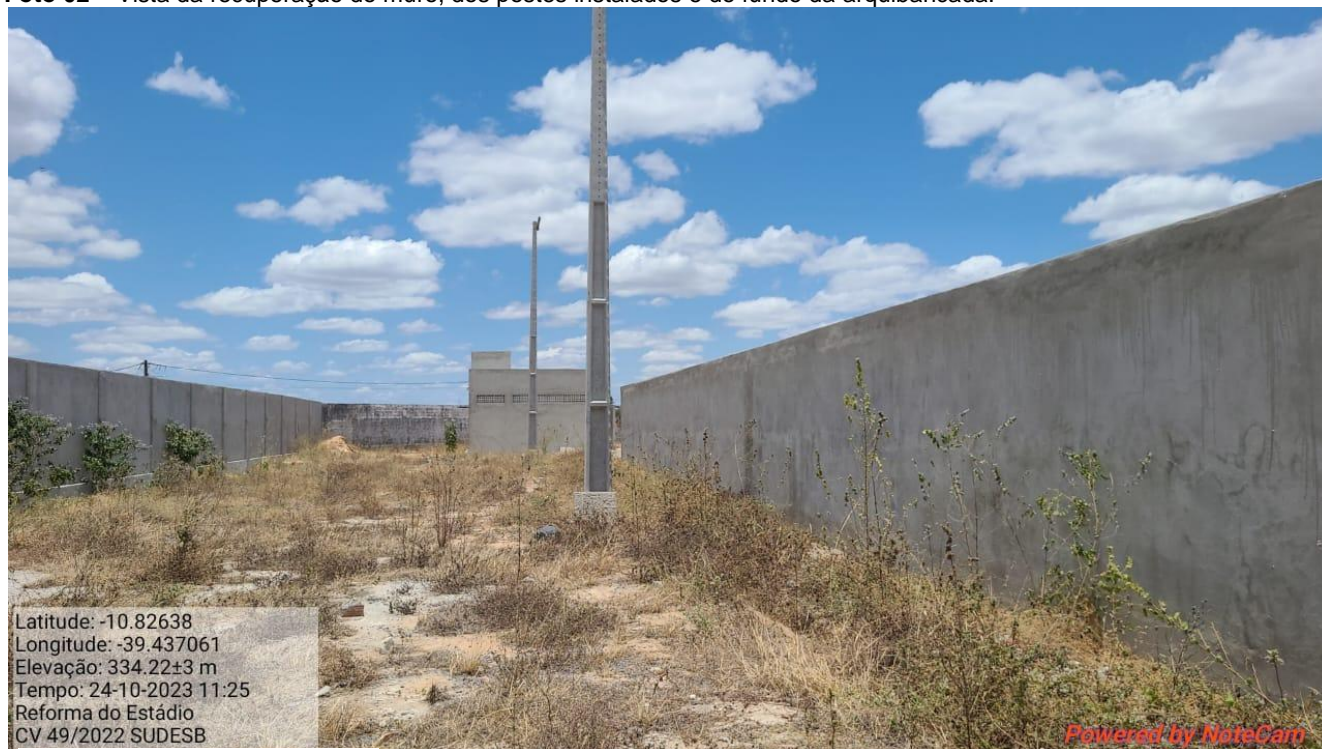


Manuel Benedito Bispo Ramos
Especialista Técnico Nível D
Projeto FLEM/SUDESB


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Ced. 68.520.107-9
CAU N.º A-12275-0

NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Nordestina, Convênio 49/22.

Foto 03 – Vista da Arquibancada e dos postes do sistema de iluminação.



Foto 04 – Vista externa do Sanitário Público.



Manuel Benedito Bispo Ramos
Especialista Técnico Nível D
Projeto FLEM/SUDESB

Luiz Antonio Brantos
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N.º A-12275-0

NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO


Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Nordestina, Convênio 49/22.

Foto 05 – Vista do poço escavado.



Foto 06 – Vista externa dos vestiários.




Manuel Beredito Bispo Ramos
Especialista Técnico Nível D
Projeto FLEM/SUDES B


Luiz Antonio Brantos
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N° A-12275-0
