



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
28/06/2023

Município Itajuípe	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Litoral Sul – CDS do Território Litoral Sul	Responsável Antônio Mário Damasceno
Contato Patrick Olberan Monteiro	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal Humberto Badaró Localizado no Município de Itajuípe/BA

Endereço
Sede do Município Itajuípe/BA

Convênio 53/22	Processo 069.1475.2022.0001675-54	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 21/05/2022		Valor do Convênio R\$ 454.741,90	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 228.285,67

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Itajuípe, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Humberto Badaró, município de Itajuípe, objeto do convênio nº 53/22 no valor de R\$ 454.741,90 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro mil, Setecentos e Quarenta e Um reais e Noventa centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.467,24	1.650,00	30,18%	10.934,48	7.117,24	65,09%
SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	0,00%	10.045,55	10.045,55	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	165.509,76	-	0,00%	331.019,52	123.647,90	37,35%
PINTURA GERAL	45.433,67	-	0,00%	90.867,35	90.867,35	100,00%
INSTALAÇÃO DE TOTEM INSTITUCIONAL	11.875,00	-	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	228.285,67	1.650,00	0,72%	454.741,90	231.678,04	50,95%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 53/22, no valor de R\$ 228.285,67 (duzentos e vinte e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brandes.	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 30/06/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brandes.		

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Humberto Badaró, Município de Itajuípe, Convênio 53/22.



FOTO 01 – Vista da Arquibancada

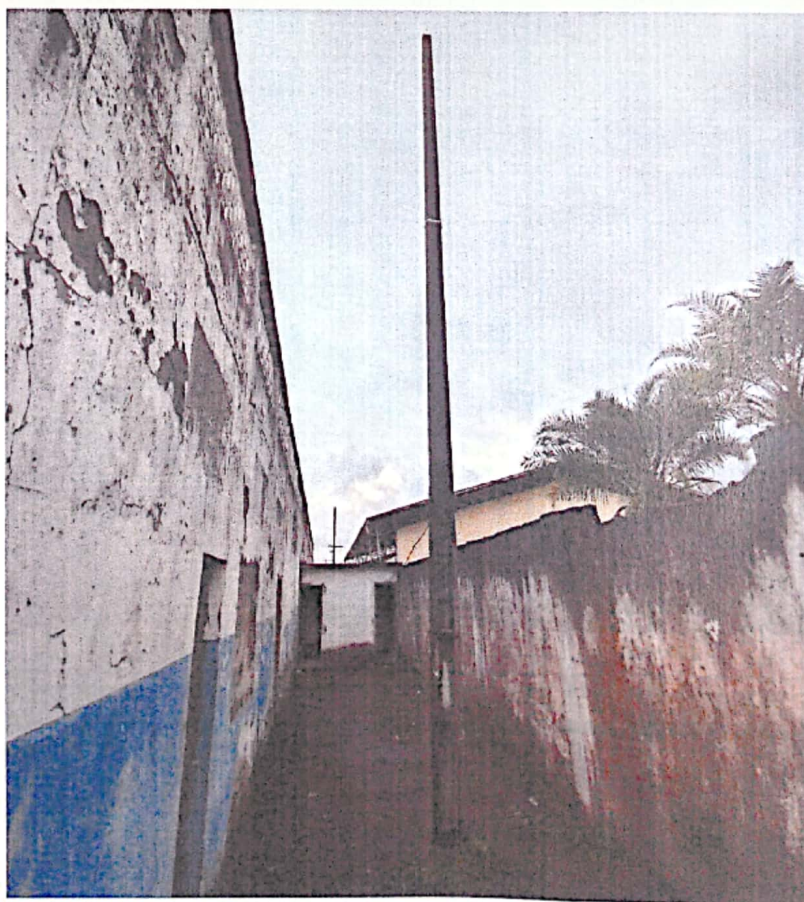


FOTO 02 – Postes novos ainda não implantados
