



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
11/12/2023

Município Oliveira dos Brejinhos	Assunto Vistoria de Convênio		
Interessado Prefeitura Municipal de Oliveira dos Brejinhos	Responsável Silvando Brito Santos		
Contato Rilton Aderlan Soares Pereira	Cargo Engenheiro		
Objeto Reforma do Estádio Municipal			
Endereço Sede do Município			
Convênio 64/22	Processo 069.1479.2022.0002211-16	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 04/06/2022		Valor do Convênio R\$ 599.464,62	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 290.610,80

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Oliveira dos Brejinhos, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, município de Oliveira dos Brejinhos, objeto do convênio nº 64/22 no valor de R\$ 599.464,62 (quinhentos e noventa e nove mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.131,04	1.565,52	50,00%	6.262,08	4.696,56	75,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES				9.134,74	9.134,74	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NATURAL COM IRRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇO	187.433,93	166.465,93	88,81%	374.867,86	353.899,86	94,41%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	32.353,73	1.235,37	3,82%	129.414,92	98.296,56	75,95%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	31631,25	0,00	0,00%	31.631,25	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO NOS ACESSOS PRINCIPAIS (PISO INTERTRAVADO)	24.185,85	12.092,92	50,00%	36.278,77	24.185,84	66,67%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11875,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	290.610,80	181.359,74	62,41%	599.464,62	490.213,56	81,78%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como não cumprida a 2ª parcela do convênio nº 64/22, no valor de R\$ 290.610,80 (duzentos e noventa mil, seiscentos e dez reais e oitenta centavos).

Responsável CARLOS A.C. OLIVEIRA.	Cargo / CREA/Cadastro ANALISTA TECNICO.	Data do Relatório 12/12/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: LUIZ ANTONIO ALMEIDA BRANDES	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Carlos Antonio Carvalho de Oliveira
Analista Técnico Nível B
Projeto FLEM/SUDES B

Luiz Antonio Brandes
Coordenador de Obras / SUDES B
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Oliveira dos Brejinhos, Convênio 64/22.
Foto 01 – placa da obra.



Foto 02 – Implantação do gramado natural.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Oliveira dos Brejinhos, Convênio 64/22.
Foto 01 – placa da obra.



Foto 02 – Implantação do gramado natural.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Oliveira dos Brejinhos, Convênio 64/22.
Foto 03 – implantação do sistema de iluminação (quadro padrão).

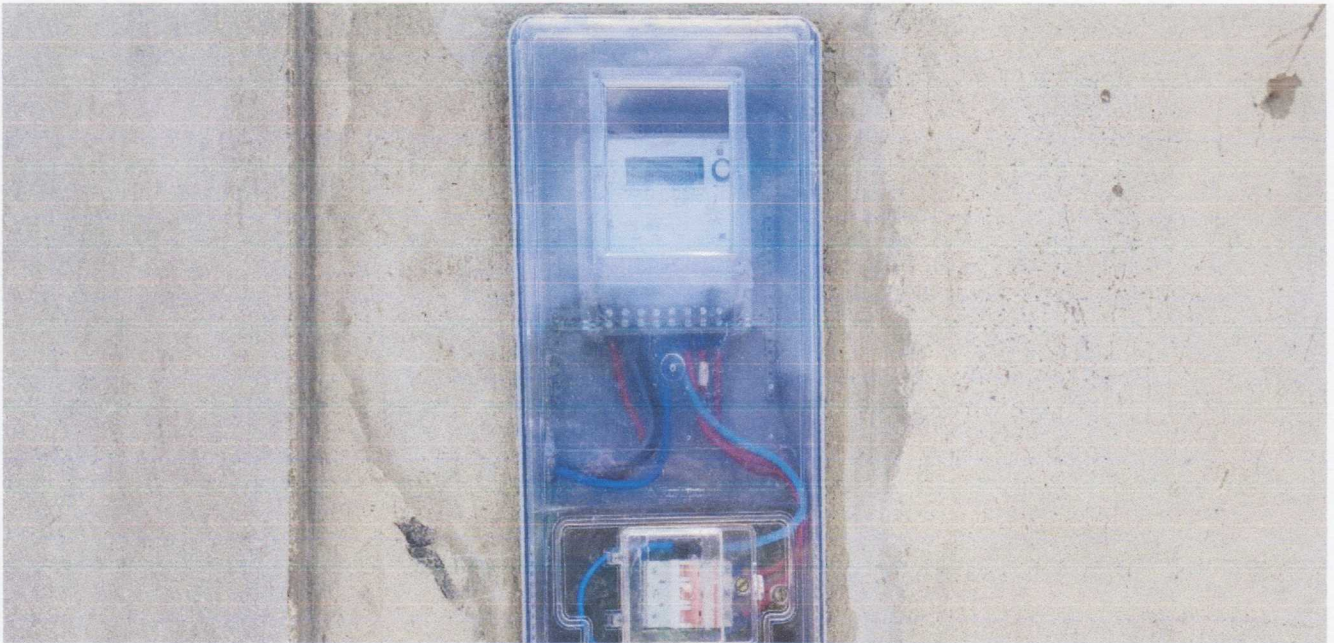


Foto 04 - Implantação da pavimentação.



Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras / SUDESB
Cad. 09520107-9
CAU A-12275-0
