

**NOTIFICAÇÃO COB N° 22/2021**

Salvador/Ba, 06 de agosto de 2021.

**Exmo. Sr.**  
**Enilson Marcelo Rodrigues da Silva**  
**Prefeito do Município de Campo Alegre de Lourdes**  
**Campo Alegre de Lourdes/Ba**


**Assunto:** Encaminhando laudo da 1ª vistoria da 3ª parcela do convênio n° 20/2019, referente à reforma do Estádio Municipal de Futebol.

Senhor Prefeito,

Informamos a V. Exa. que após vistoria realizada pela equipe técnica desta SUDESB, à obra de reforma do Estádio Municipal de Futebol, objeto do convênio n° 20/2019, constatamos que os serviços referente a 3ª parcela não foram cumpridos, conforme laudo de vistoria técnica anexo.

Quaisquer dúvidas nos contactar através dos telefones: (71) 3116-9220/43.

Atenciosamente,



Luiz Antônio A. Brantes  
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção.



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da  
Vistoria  
02/08/2021

<b>Município</b> Campo Alegre de Lourdes	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Lourdes	<b>Responsável</b> Enilson Marcelo Rodrigues da Silva - Prefeito
<b>Contato</b> Allane de Brito Ribeiro	<b>Cargo</b> Engenheira Civil

**Objeto**  
Implantação de Iluminação em LED para Campo de Futebol e Gramado de Campo Tamanho Oficial 107x70m.

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 20/19	<b>Processo</b> 069.1479.2019.0002648-81	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (Três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1º Vistoria da 3ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 11/12/2019		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 536.099,38	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 160.829,82

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Campo Alegre de Lourdes, onde foi vistoriada a obra de Implantação de Iluminação em LED para Campo de Futebol e Gramado de Campo Tamanho Oficial 107x70m, objeto do convênio nº 20/19, no valor de R\$ 536.099,38 (quinhentos e trinta e seis mil e noventa e nove reais e trinta e oito centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	67.084,81	33.542,31	50,00%	223.616,02	190.073,57	85,00%
GRAMADO DE CAMPO OFICIAL 107X70M	93.745,01	46.872,51	50,00%	312.483,36	265.610,86	85,00%
<b>TOTAL</b>	<b>160.829,82</b>	<b>80.414,81</b>	<b>50,00%</b>	<b>536.099,38</b>	<b>455.684,42</b>	<b>85,00%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos **como não cumprida** a 3ª parcela do convênio nº 20/19, no valor de R\$ 160.829,82 (cento e sessenta mil e oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos)

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	<b>Data do Relatório</b>  03/08/2021
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU N° A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Implantação de Iluminação em LED para Campo de Futebol e  
Gramado de Campo Tamanho Oficial 107x70m  
Município de Campo Alegre de Lourdes Convênio 20/19.**

**Foto 01 - Vista do plantio da grama no campo de futebol. Foto 02 - Vista do plantio da grama no campo de futebol.**



**Foto 03 – Vista geral do gramado e postes instalados. Foto 04 - Vista dos Postes**

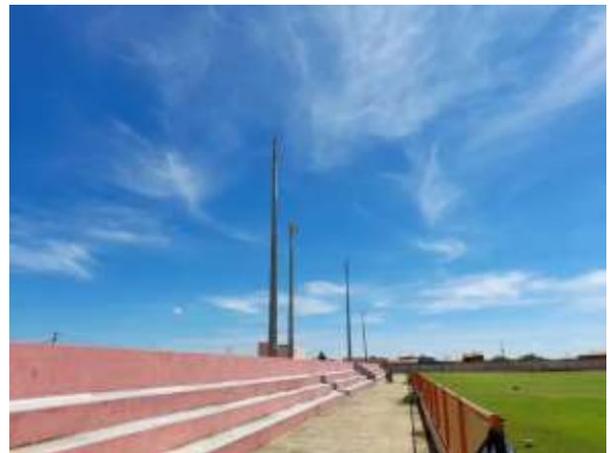

*Antonio Brantes*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 68.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0
