

**NOTIFICAÇÃO COB N° 44/2020**

**Lauro de Freitas/Ba, 25 de agosto de 2020.**

**Exma. Sra.  
Rosângela Maria Monteiro de Menezes  
Prefeita do Município de Campo Formoso  
Campo Formoso/Ba**


**Assunto:** Encaminhando laudo da 2ª vistoria da 1ª parcela do convênio n° 16/2019, referente à reforma do Ginásio de Esportes.

Senhora Prefeita,

Informamos a V. Exa. que após vistoria realizada pela equipe técnica desta SUDESB, à obra de reforma do Ginásio de Esportes, objeto do convênio n° 16/2019, constatamos que os serviços referente 1ª parcela foram cumpridos, conforme laudo de vistoria técnica anexo.

Quaisquer dúvidas nos contactar através dos telefones: (71) 3103-0981/0990.

Atenciosamente,



Luiz Antônio A. Brantes  
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção.



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/02

Data da Vistoria  
10/08/2020

<b>Município</b> Campo Formoso	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Campo Formoso	<b>Responsável</b> Rosângela Maria Monteiro de Menezes - Prefeita
<b>Contato</b> Rosângela Maria Monteiro de Menezes	<b>Cargo</b> Prefeita

**Objeto**  
Reforma do Ginásio de Esportes

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 16/19	<b>Processo</b> 069.1479.2019.0002364-11	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (Três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 2º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 05/12/2019		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 510.296,70	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 255.148,35

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Campo Formoso, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Ginásio, objeto do convênio nº16/19, no valor de R\$ 510.296,70 (quinhentos e dez mil e duzentos e noventa e seis reais e setenta centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES	2.182,14	2.182,14	100,00%	2.182,14	2.182,14	100,00%
REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO	2.980,70	2.980,70	100,00%	2.980,70	2.980,70	100,00%
PAREDES	1.458,03	1.458,03	100,00%	1.458,03	1.458,03	100,00%
ESQUADRIA DE MADEIRA	11.573,64	11.573,64	100,00%	11.573,64	11.573,64	100,00%
ESQUADRIA DE METALICA	24.962,89	24.962,89	100,00%	24.962,89	24.962,89	100,00%
ALVENARIA	1.557,60	1.557,60	100,00%	1.557,60	1.557,60	100,00%
VIDROS	1.599,87		0,00%	1.599,87	0,00	0,00%
COBERTURA	46.914,05	46.914,05	100,00%	46.914,05	46.914,05	100,00%
PINTURA		117.164,12		146.455,15	117.164,12	80,00%
INSTALAÇÕES ELETRICAS	42.542,70		0,00%	42.542,70	0,00	0,00%
INSTALAÇÕES HIDROSSANTARIAS	5.332,10		0,00%	5.332,10	0,00	0,00%
ALAMBRADO	23.434,48	46.355,18	197,81%	130.262,08	46.355,18	35,59%
DIVERSOS	90.610,15	0,00	0,00%	90.610,15	0,00	0,00%
LIMPEZA				1.865,60	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>255.148,35</b>	<b>255.148,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>510.296,70</b>	<b>255.148,35</b>	<b>50,00%</b>

Luiz Antonio Brantós  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 02/02

Data da Vistoria  
12/08/2020

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos **como cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 16/19 (2ª vistoria), no valor de R\$ 255.148,35 (duzentos e cinquenta e cinco mil e cento e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos)

**Responsável**  
Luiz Antonio Almeida Brantes

**Cargo / Registro no Conselho /  
Cadastro**  
Arquiteto – CAU – BA: A 122750 –  
CAD 69.520107-9

**Data do Relatório**  
12/08/2020

**Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:**  
Luiz Antonio Almeida Brantes

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Ginásio de Esportes  
Município de Campo Formoso, Convênio 16/2019.**

**Foto 01 - Reforma do estrutura metálica da cobertura**



**Foto 02 - Telhamento com telha de metálica**



*R*



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA.

**Relatório Fotográfico da Reforma do Ginásio de Esportes  
Município de Campo Formoso, Convênio 16/2019.**

Foto 03 - Área interna pintada e com as esquadrias

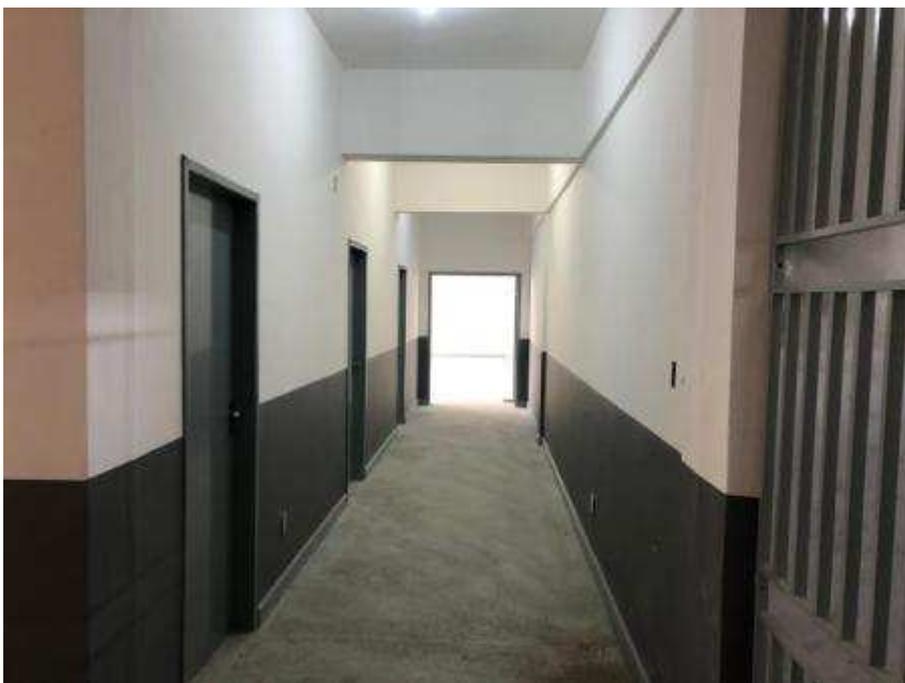


Foto 04 - Alambrado interno em construção



*Antonio Brantes*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 88 520 107-9  
CAU N° A-12275-0
