



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
**RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO**

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
07/08/2020

<b>Município</b> Campo Formoso	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Campo Formoso	<b>Responsável</b> Rosângela Maria Monteiro de Menezes - Prefeita
<b>Contato</b> Thiago de Jesus Rosa	<b>Cargo</b> Assessor de Projetos

**Objeto**  
Reforma do Estádio Municipal

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 17/19	<b>Processo</b> 069.1479.2019.0002360-80	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (Três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1º Vistoria da 2ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 05/12/2019		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 383.518,54	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 95.879,63

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Campo Formoso, onde foi vistoriada a obra de reforma do Estádio, objeto do convênio nº 17/19, no valor de R\$ 383.518,54 (trezentos e oitenta e três mil e quinhentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos) foi constatado que a obra esta em andamento,

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	48.937,64	79.098,48	161,63%	195.750,56	195.750,56	100,00%
ALAMBRA DO REVESTIDO EM PVC COM 380M DE COMPRIMENTO E 2M DE ALTURA SOBRE MUREA EXISTENTE	46.941,99	0,00	0,00%	187.767,98	75.107,20	40,00%
<b>TOTAL</b>	<b>95.879,63</b>	<b>79.098,48</b>	<b>82,50%</b>	<b>383.518,54</b>	<b>270.857,76</b>	<b>70,62%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos **como não cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 17/19, no valor de R\$ 95.879,63 (noventa e cinco mil oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos )

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	<b>Data do Relatório</b>  10/08/2020
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad 69 520 107-9  
CAU Nº A: 12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção de Quadra Poliesportiva  
Município de Capim Grosso, Convênio 17/2018.**

**Foto 01 - Implantação dos postes de iluminação**



**Foto 02 - Torre de iluminação em funcionamento**

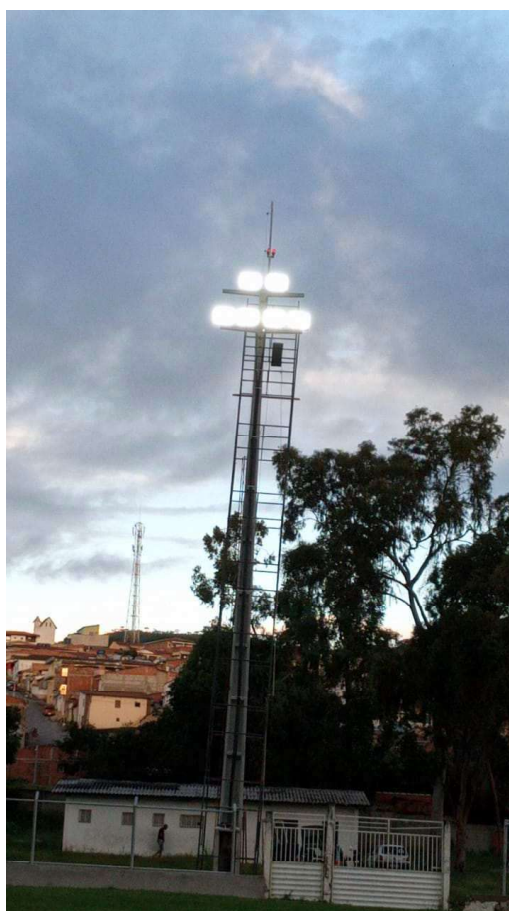

10

**Relatório Fotográfico da Construção de Quadra Poliesportiva  
Município de Capim Grosso, Convênio 17/2018.**

Foto 03 - Poste de iluminação instalado



Foto 04 - Implantação dos postes de iluminação



*Luiz Antonio Brandes*  
Luiz Antonio Brandes  
Coordenador de Obras  
Ced. 68 520 107-9  
CAU N.º A-12275-0
