



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
03/12/2020

Município Capim Grosso		Assunto Vistoria de Convênio	
Interessado Prefeitura Municipal de Capim Grosso		Responsável Lydia Fontoura Pinheiro - Prefeita	
Contato Lydia Fontoura Pinheiro		Cargo Prefeita	
Objeto Construção de Arquibancada do Estádio Municipal			
Endereço Sede do Município			
Convênio 21/19	Processo 069.1479.2019.0002713-14	Nº de Parcelas 03 (Três)	Parcela Vistoriada 1ª Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 11/12/2019		Valor do Convênio R\$ 280.904,32	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 84.271,30

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Capim Grosso, onde foi vistoriada a obra de Construção do Estádio, objeto do convênio nº21/19, no valor de R\$ 280.904,32 (duzentos e oitenta mil e novecentos e quatro reais e trinta e dois centavos) foi constatado que a obra esta em andamento,

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES	2.968,18	2.968,18	100,00%	27.225,65	24.257,47	89,10%
FUNDAÇÃO				50.218,16	50.218,16	100,00%
SUPERESTRUTURA	25.659,87	25.659,87	100,00%	66.514,15	66.514,15	100,00%
ALVENARIA	55.643,25	55.643,25	100,00%	74.851,09	55.643,25	74,34%
ESQUADRIA METALICA				41.846,94		0,00%
PAVIMENTAÇÃO				447,41		0,00%
REVESTIMENTO				15.012,52		0,00%
PINTURA				4.089,52		0,00%
LIMPEZA				698,88		0,00%
TOTAL	84.271,30	84.271,30	100,00%	280.904,32	196.633,03	70,00%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 21/19, no valor de R\$ 84.271,30 (oitenta e quatro mil duzentos e setenta e um reais e trinta centavos)

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Data do Relatório 04/12/2020
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68 520 107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção de Arquibancada do Estádio Municipal
Município de Capim Grosso Convênio 21/19.
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Foto 01 Vista lateral esquerda da arquibancada



Foto 02 - Vista lateral direita da arquibancada



Handwritten signature or mark in blue ink.

**Relatório Fotográfico da Construção de Arquibancada do Estádio Municipal
Município de Capim Grosso Convênio 21/19.**

Foto 03 - Vista posterior da arquibancada



Foto 04 - Vista frontal da arquibancada

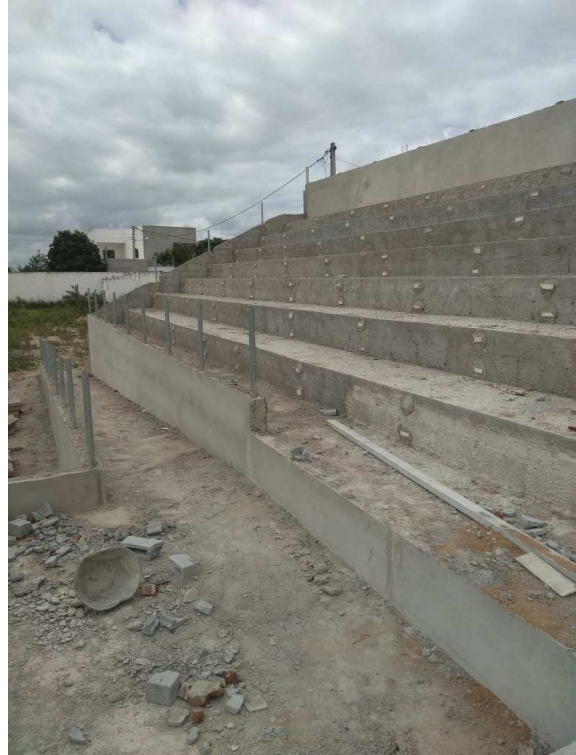


Foto 04 - Vista dos degraus da arquibancada

