

NOTIFICAÇÃO COB N° 02/2021

Lauro de Freitas/Ba, 09 de fevereiro de 2021.

**Exmo. Sr.
Nilson José Rodrigues
Prefeito do Município de Correntina
Correntina/Ba**

Assunto: Encaminhando laudo da 4^a vistoria da 1^a parcela do convênio nº 23/2019, referente à construção da Areninha Society.

Senhor Prefeito,

Informamos a V. Exa. que após vistoria realizada pela equipe técnica desta SUDESB, à obra de construção da Areninha Society, objeto do convênio nº 23/2019, constatamos que os serviços referente 1^a parcela foram cumpridos, conforme laudo de vistoria técnica anexo.

Quaisquer dúvidas nos contactar através dos telefones: (71) 3103-0981/0990.

Atenciosamente,


Luiz Antônio A. Brantes
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção.



**SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO**

FLS. 01/01

Data da Vistoria
05/02/2021

Município Correntina	Assunto Vistoria de Convênio		
Interessado Prefeitura Municipal de Correntina	Responsável Nilson José Rodrigues - Prefeito		
Contato Lucas Araujo Silva	Cargo Engenheiro		
Objeto Construção da Areninha Society			
Endereço Sede do Município			
Convênio 23/19	Processo 069.1479.2019.0002706-95	Nº de Parcelas 02 (Duas)	Parcela Vistoriada 4º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 12/12/2019		Valor do Convênio R\$ 597.828,26	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 298.914,13

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Correntina, onde foi vistoriada a obra da Areninha Society objeto do convênio nº23/19, no valor de R\$ 597.828,26 (quinhentos e noventa e sete mil e oitocentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavo) foi constatado que a obra está em andamento,

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9.553,80	9.553,80	100,00%	19.107,60	9.553,80	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.217,72	7.217,72	100,00%	14.435,45	7.217,72	50,00%
CAMPO ALTERNATIVO (50X30)M	134.446,10	268.892,19	200,00%	268.892,19	268.892,19	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM COMPRESSOR	81.246,41	162.492,82	200,00%	162.492,82	162.492,82	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO ALTERNATIVO	9.339,33	9.339,33	100,00%	18.678,66	9.339,33	50,00%
VESTIÁRIO TIPO “C-3”.	57.110,77	57.110,77	100,00%	114.221,54	57.110,77	50,00%
TOTAL	298.914,13	514.606,63	100,00%	597.828,26	514.606,63	86,08%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como cumprida** a 1ª parcela (4ª vistoria) do convênio nº 23/19, no valor de R\$ 298.914,13 (duzentos e noventa e oito mil e novecentos e quatorze reais e treze centavos)


Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520 107-9	Data do Relatório 08/02/2021
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

**Relatório Fotográfico da Obra de Construção de Areninha Society do Município de
Correntina, Convênio 23/2019.**

Foto 01 - Fornecimento e instalação do campo de grama sintética e postes de iluminação



Foto 01 - Construção do vestiário, na fase de reboco das alvenarias.

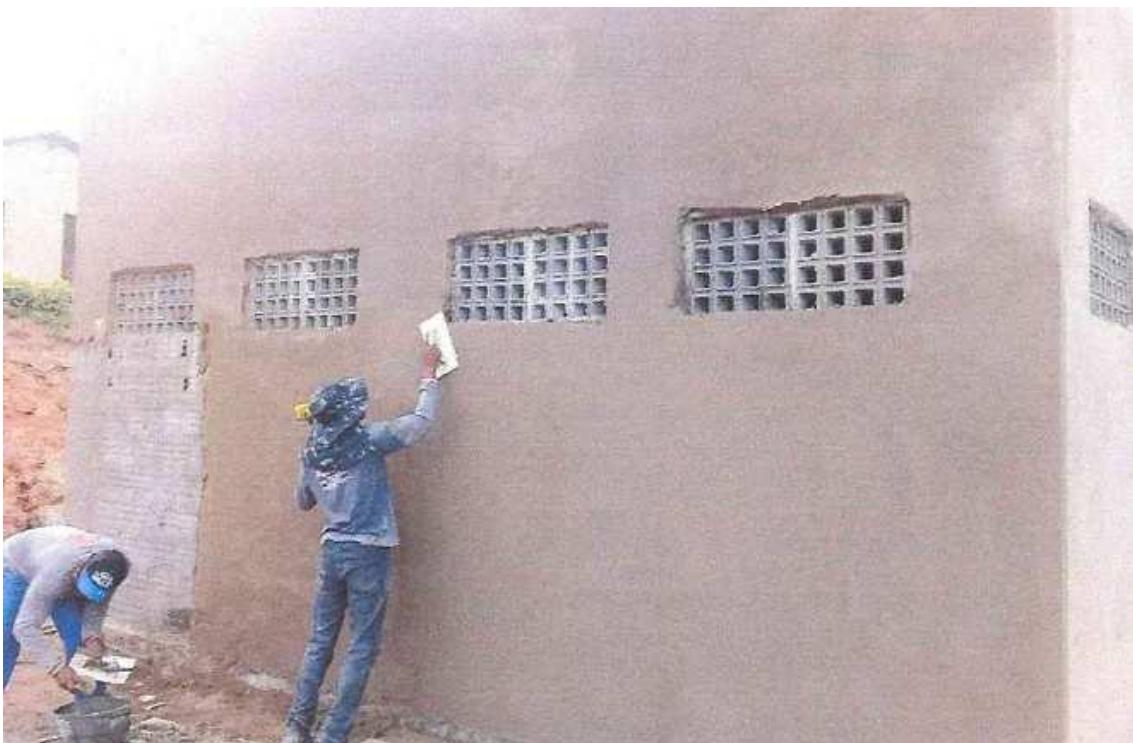

**Relatório Fotográfico da Obra de Construção de Areninha Society do Município de
Correntina, Convênio 23/2019.**

Foto 03 Construção do vestiário, iniciando as instalações hidráulicas.



Foto 04 - Alambrado e equipamentos esportivos instalados



Morais
