



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Esportes do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS. 01/02

Data da Vistoria
17/10/2019

Município Cruz das Almas	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Cruz das Almas	Responsável Orlando Peixoto Pereira Filho - Prefeito
Contato Felipe Viveiros	Cargo Secretário de Planejamento

Objeto
Reforma do Estádio

Endereço
Município - Sede

Convênio 10/2018	Processo	Nº de Parcelas: 03(três)	Parcela vistoriada 1ª vistoria - 1ª parcela
Publicação no D.O. E. 29/03/2018	Valor da Obra R\$ 799.767,87	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 315.058,56	

LAUDO TÉCNICO:
Em visita ao Município de Cruz das Almas, foi vistoriada a obra de Reforma Estádio, objeto do convênio nº 10/2018, no valor de R\$ 799.767,87 (Setecentos e noventa e nove mil setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

ITEM	SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
		Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
1.0	Reforma dos Sanitários Públicos, vestiários e demais áreas internas	118.746,69	118.746,69	100,00%	356.240,06	118.746,69	33,33%
2.0	Iluminação do Campo	94.503,68	0,00	0,00%	189.007,36	0,00	0,00%
3.0	Gramado e Irrigação de Campo Oficial	101.808,19	101.808,19	100,00%	254.520,45	101808,19	40,00%
	TOTAL	315.058,56	220.554,88	70,00%	799.767,87	220554,88	27,58%

CONCLUSÃO:

Avaliação da obra:

- Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida a 1ª parcela** (1ª vistoria) do convênio nº 10/2018, no valor de R\$ 315.058,56 (Trezentos e quinze mil cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Responsável Luiz Antônio A. Brantes 	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data 21/10/2019
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes 		

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio do Município de
Cruz das Almas, Convênio 10/2018.**

Foto 01 – Vista da placa da obra.



Foto 02 – Reforma dos sanitários e vestiários



**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio do Município de
Cruz das Almas, Convênio 10/2018.**

Foto 03 – Reforma dos sanitários e vestiários

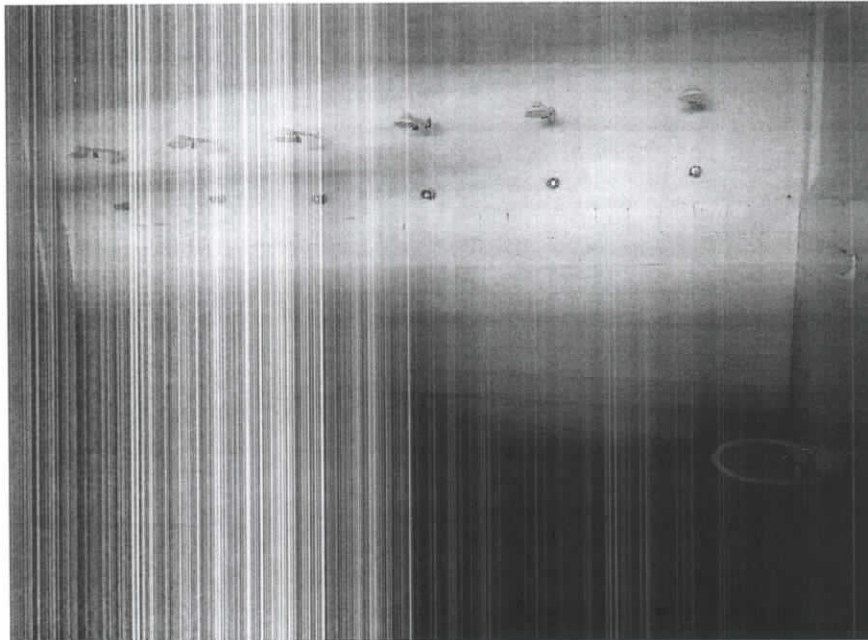


Foto 04 – instalação da irrigação do gramado

