



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Esportes do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS.

Data da Vistoria
03/06/2019

Município Paripiranga	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Paripiranga	Responsável Justino das Virgens Neto - Prefeito
Contato ANTONIO SANTANA CARREGOSA	Cargo Secr. Administração

Objeto
Construção de Reforma Estádio

Endereço
Município - Sede

Convênio 07/2018	Processo 1602170026253	Nº de Parcelas: 03 (três)	Parcela vistoriada 1ª vistoria - 1ª parcela
Publicação no D.O. E. 21/04/18	Valor da Obra R\$ 369.484,92	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 137.944,22	

LAUDO TÉCNICO:
Em visita ao Município de Paripiranga, foi vistoriada a obra de Construção de reforma estádio, objeto do convênio nº 07/2018, no valor de R\$ 369.484,92 (Trezentos e sessenta e nove mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

ITEM	SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
		Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
1.0	Iluminação do campo	88.695,49	88.695,49	100%	221.738,73	88.695,49	40%
2.0	Campo gramado com dimensões oficiais 107x70	49.248,73	49.248,73	100%	147.746,19	49.248,73	33%
	TOTAL	137.944,22	137.944,22	100%	369.484,92	137.944,22	37%

Avaliação da obra:

- Pelos dados expostos acima, damos como cumprida a 1ª parcela do convênio nº 07/2018, no valor de R\$ 137.944,22 (Cento e trinta e sete mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

CONCLUSÃO:

Responsável Luiz Antônio A. Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data 05/06/2019
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes		

Relatório Fotográfico da Construção de Piscina Semi-Olímpica do Município de Paripiranga, Convênio 07/2018

Foto 01 – Vista parcial destacando os serviços de movimento de terra e preparação do solo.



Foto 02 – Vista parcial destacando os serviços de movimento de terra e preparação do solo.




40

Relatório Fotográfico da Construção de Piscina Semi-Olímpica do Município de Paripiranga, Convênio 07/2018

Foto 03 - Vista parcial destacando os postes e refletores já instalados.



Foto 04 - Vista parcial destacando a instalação dos painéis elétricos.

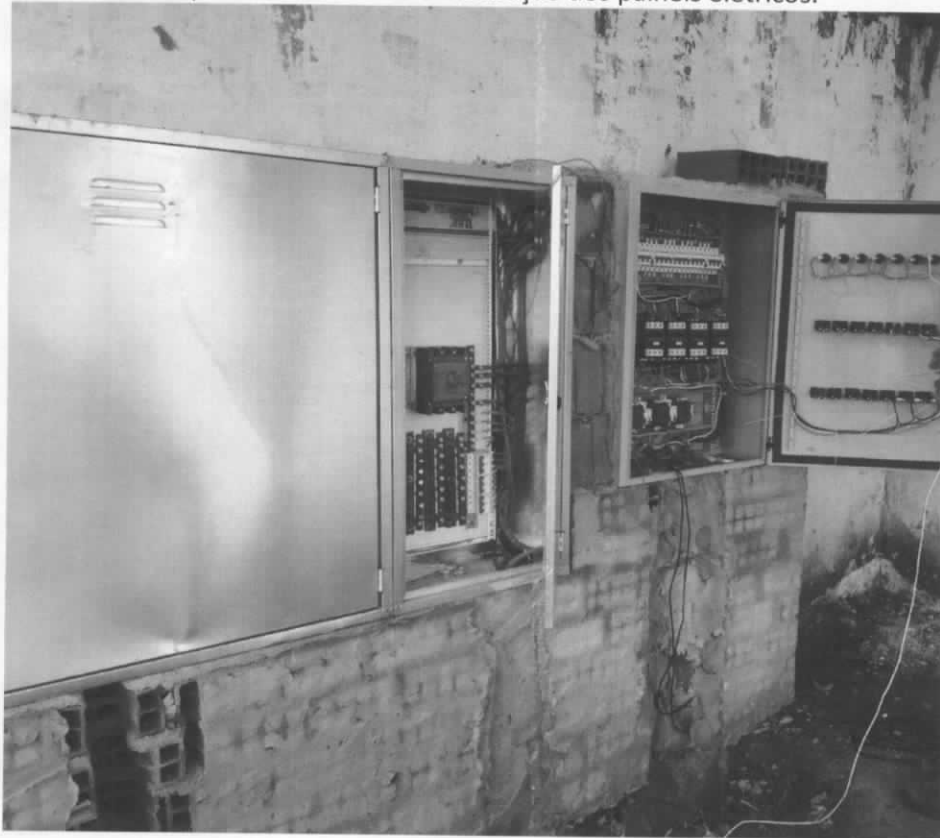

D
