



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS.

Data da Vistoria
25/02/2019

Município Pedrão	Assunto Vistoria de Convênio		
Interessado Prefeitura Municipal de Pedrão	Responsável Sosthenes Serravale Campos		
Contato Sílvio Roberto Habib	Cargo Engenheiro Civil		
Objeto Revitalização do Estádio Municipal			
Endereço Município - Sede			
Convênio 12/2018	Processo 1602170036364	Nº de Parcelas: 03(três)	Parcela vistoriada 1ª vistoria - 1ª parcela
Publicação no D.O. E. 29/03/2018	Valor da Obra R\$ 702.494,62	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 290.721,02	

LAUDO TÉCNICO:

Em visita ao Município de Pedrão, foi vistoriada a obra de Construção de Revitalização Estádio, objeto do convênio nº 12/2018, no valor de R\$ 702.494,62 (Setecentos e dois mil quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

ITEM	SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVENIO		
		Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
1.0	Grama de Campo Oficial 101x68m	207.898,28	0,00	0,00%	207.898,28		0,00%
2.0	Construção da Arquibancada com 05 degraus e comp= 50,00m	82.822,74	0,00	0,00%	165.645,49	0,00	0,00%
3.0	Sanitário Público e Bar	0,00	47.420,18	#DIV/0!	106.893,28	47.420,18	44,36%
4.0	Banco de Reservas (03 unds)	0,00			29.413,20		0,00%
5.0	Alambrado com H= 2,00m ; Mureta de 0,50m e comp de 400m	0,00			192.644,37		0,00%
	TOTAL	290.721,02	47.420,18	16,31%	702.494,62	47.420,18	6,75%

NOTA: A construção da arquibancada está sendo executada em desacordo com o projeto padrão encaminhado pela SUDESB.

Avaliação da obra:

● Pelos dados expostos acima, damos **como não cumprida** a 1ª parcela (1ª vistoria) do convênio nº 12/2018, no valor de R\$ 290.721,02 (Duzentos e noventa mil setecentos e vinte e um reais e dois centavos).

CONCLUSÃO:

Responsável Luiz Antônio A. Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data 11/03/2019
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes CAD: 69.520.107-9 CAU Nº A-12275-0		

Luiz Antonio Brantes
Coord. de Obras/SUDESB
CAD: 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Revitalização do Estádio Municipal
Município de Pedrão, Convênio 12/2018.

➤ Relatório fotografico:

Foto 01 – Sanitário Público e Bar



Foto 02 – Sanitário Público e Bar



Foto 03 – Sanitário Público e Bar



Foto 04 – Vista da Arquibancada



Foto 05 – Vista da Arquibancada

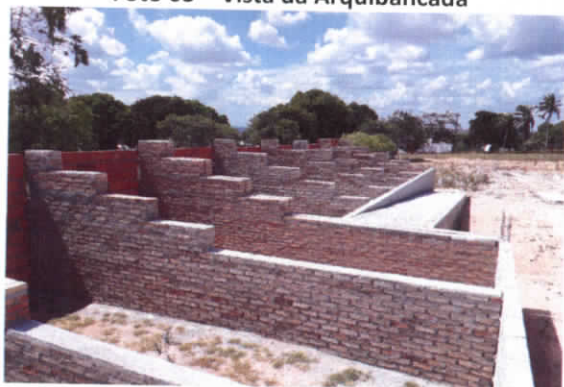


Foto 06 – Vista da Arquibancada



AD
