



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS.

Data da Vistoria
03/07/2020

Município Pedrão	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Pedrão	Responsável Sosthenes Serravale Campos
Contato Sílvio Roberto Habib	Cargo Engenheiro Civil

Objeto
Revitalização do Estádio Municipal

Endereço
Município - Sede

Convênio 12/2018	Processo 1602170036364	Nº de Parcelas: 03 (três)	Parcela vistoriada 1ª vistoria - 2ª parcela
Publicação no D.O. E. 29/03/2018	Valor da Obra R\$ 702.494,62	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 219.129,23	

LAUDO TÉCNICO:
Em visita ao Município de Pedrão, foi vistoriada a obra de Construção de Revitalização Estádio, objeto do convênio nº 12/2018, no valor de R\$ 702.494,62 (Setecentos e dois mil quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:


ITEM	SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
		Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
1.0	Grama de Campo Oficial 101x68m	0,00			207.898,28	43.000,00	20,68%
2.0	Construção da Arquibancada com 05 degraus e comp= 50,00m	82.822,75	65.822,75	79,47%	165.645,49	162.102,75	97,86%
3.0	Sanitário Público e Bar	106.893,28	75.893,28	71,00%	106.893,28	139.476,28	130,48%
4.0	Banco de Reservas (03 unds)	29.413,20		0,00%	29.413,20		0,00%
5.0	Alambrado com H= 2,00m ; Mureta de 0,50m e comp de 400m	0,00	77.413,20		192.644,37	163.271,22	84,75%
	TOTAL	219.129,23	219.129,23	100%	702.494,62	507.850,25	72,29%

Avaliação da obra:

• Pelos dados expostos acima, damos como cumprida a 2ª parcela do convênio nº 12/2018, no valor de R\$ 219.129,23 (Duzentos e dezenove mil cento e vinte e nove reais e vinte e três centavos).

CONCLUSÃO:

Responsável Luiz Antônio A. Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data 07/07/2020
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520 107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Revitalização do Estádio Municipal
Município de Pedrão, Convênio 12/2018.**

Foto 01 – Vista parcial destacando o interior da lanchonete



Foto 02 – Vista parcial destacando o interior do sanitário

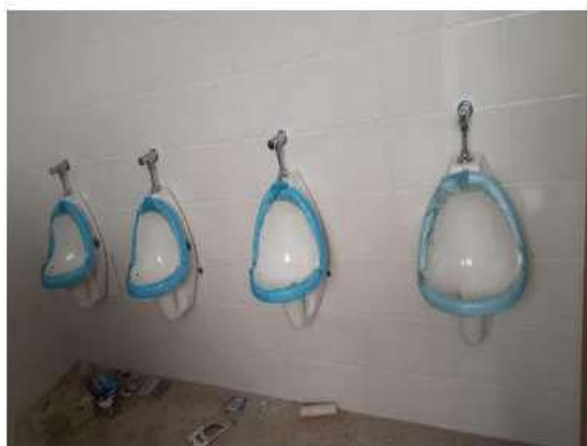


Foto 03 – Vista parcial destacando o alambrado e a arquibancada construídos



P

**Relatório Fotográfico da Revitalização do Estádio Municipal
Município de Pedrão, Convênio 12/2018.**

Foto 04 – Vista parcial destacando o alambrado e os trabalhos do gramado em execução



Foto 05 – Vista parcial destacando a arquibancada, o alambrado e os trabalhos do gramado em execução



Antonio
Luz Antonio Brantus
Coordenador de Obras
Cad. 68 520 107-9
CAU Nº A-12275-0
