



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
06/09/2022

Município Bonito	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Bonito	Responsável Reinan Cedro de Oliveira
Contato Oldegar Martins de Souza	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção de Areninha 50x30m

Endereço
Sede do Município

Convênio 28/22	Processo 069.1479.2022.0000876-31	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 04/05/22		Valor do Convênio R\$ 919.694,71	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 442.630,05

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Bonito, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m, município de Bonito, objeto do convênio nº 28/22 no valor de R\$ 919.694,71 (novecentos e dezenove mil e seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22.841,28	22.841,28	100,00%	45.682,56	22.841,28	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	77.870,93	77.870,93	100,00%	77.870,93	77.870,93	100,00%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	14.902,28	14.902,28	100,00%	14.902,28	14.902,28	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 4,00M DE REDE DE PROTEÇÃO	162.280,67	191.483,74	118,00%	324.561,34	191.483,74	59,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA EM CAMPO DE FUTEBOL	164.734,89	0,00	0,00%	329.469,78	0,00	0,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA	0,00	35.627,99	100,00%	87.963,12	35.627,99	40,50%
PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	27.369,70	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	442.630,05	342.726,22	77,43%	919.694,71	342.726,22	37,27%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 28/22, no valor de R\$ 442.630,05 (quatrocentos e quarenta e dois mil e seiscentos e trinta reais e cinco centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 08/09/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

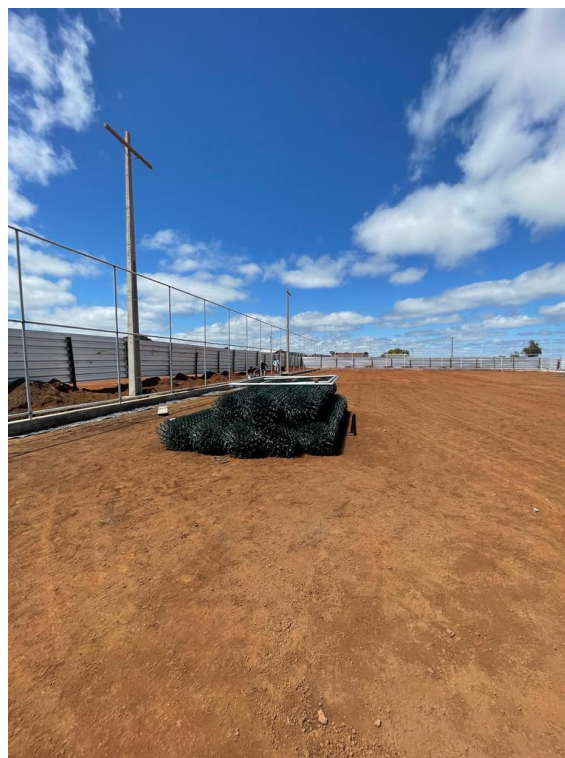

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad 69 520 107-9
CAU N° A-12275-0

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Bonito, Convênio 28/22.

Foto 01 – Visão geral da área (placa de obra, tapume, construção de alambrado e instalação de postes para sistema de iluminação).



Foto 02 – Visão interna (construção de alambrado e instalação de postes para sistema de iluminação).



Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520.107-9
CAU N.º A-12275-0
