



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
25/08/2022

Município Ibicuí		Assunto Vistoria de Convênio	
Interessado Prefeitura Municipal de Ibicuí		Responsável Marcos Galvão de Assis	
Contato Cleones Silva Matos		Cargo Engenheiro	
Objeto Construção de Areninha Society			
Endereço Sede do Município			
Convênio 03/21	Processo 069.1479.2021.0002577-13	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 16/12/2021		Valor do Convênio R\$ 923.784,00	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 365.512,29

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Ibicuí, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha Society, município de Ibicuí, objeto do convênio nº 03/21 no valor de R\$ 923.784,00 (novecentos e vinte e três mil e setecentos e oitenta e quatro reais) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.907,68	7.907,68	100,00%	23.723,04	7.907,68	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	40.681,29	40.681,29	100,00%	40.681,29	40.681,29	100,00%
INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NO CAMPO DE FUTEBOL 42X22M	73.656,00	0,00	0,00%	171.864,00	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 4,00M E REDE DE PROTEÇÃO	159.336,23	0,00	0,00%	265.560,39	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-3	0,00	57.758,11	100,00%	215.934,07	57.758,11	26,75%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 30M COM ACESSIBILIDADE	83.931,09	29.766,20	35,47%	83.931,09	29.766,20	35,47%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED	0,00	0,00	0,00%	65.971,22	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	41.893,90	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	10.625,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	0,00	0,00	0,00%	3.600,00	0,00	0,00%
TOTAL	365.512,29	136.113,28	37,24%	923.784,00	136.113,28	14,73%


CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 03/21, no valor de R\$ 365.512,29 (trezentos e sessenta e cinco mil e quinhentos e doze reais e vinte e nove centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 08/09/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad 69 520 107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha Society, Município de Ibicuí, Convênio 03/21.

Foto 01 – Visão geral da obra (construção de vestiário e arquibancada).

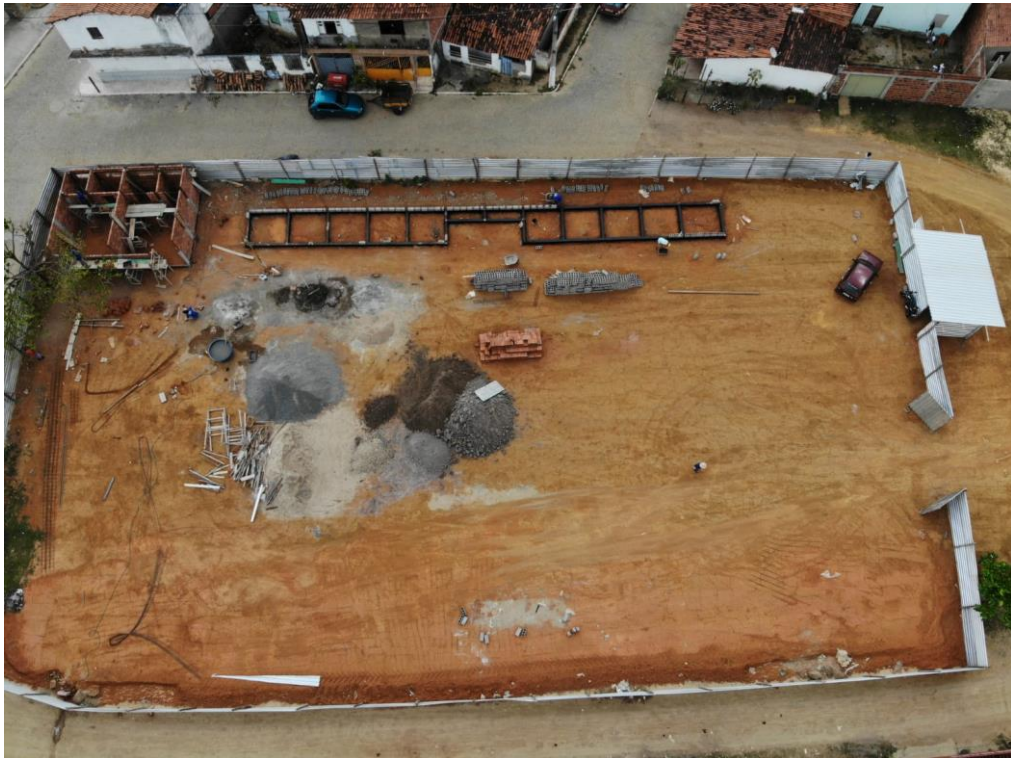

Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Ced. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0
