



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
06/09/2022

Município Itapebi	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Itapebi	Responsável Juarez da Silva Oliveira
Contato Reinan Santiago de Souza	Cargo Engenheiro

Objeto
Implantação do sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal

Endereço
Sede do Município

Convênio 45/22	Processo 069.1475.2022.0001874-07	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 18/05/2022		Valor do Convênio 398.418,13	Valor da Parcela Vistoriada 204.492,01

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Itapebi, onde foi vistoriada a obra de Implantação do sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal, objeto do convênio nº 45/22 no valor de R\$ 398.418,13 (trezentos e noventa e oito mil e quatrocentos e dezoito reais e treze centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.541,36	16.541,36	100,00%	33.082,72	16.541,36	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	22.440,89	22.440,89	100,00%	22.440,89	22.440,89	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA	165.509,76	68.549,74	41,42%	331.019,52	68.549,74	20,71%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL			0,00%	11875,00	0,00	0,00%
TOTAL	204.492,01	107.531,99	52,58%	398.418,13	107.531,99	26,99%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 45/22, no valor de R\$ 204.492,01 (duzentos e quatro mil e quatrocentos e noventa e dois reais e um centavo).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 08/09/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Implantação do sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal, Município de Itapebi, Convênio 45/22.

Foto 01 – Vista da placa da obra.



Foto 02 – Caixa de alvenaria com tampa.



(Handwritten signature or mark)

Relatório Fotográfico da Implantação do sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal, Município de Itapebi, Convênio 45/22.

Foto 03 – Escavação de vala para caixa de alvenaria /passagem de cabos.

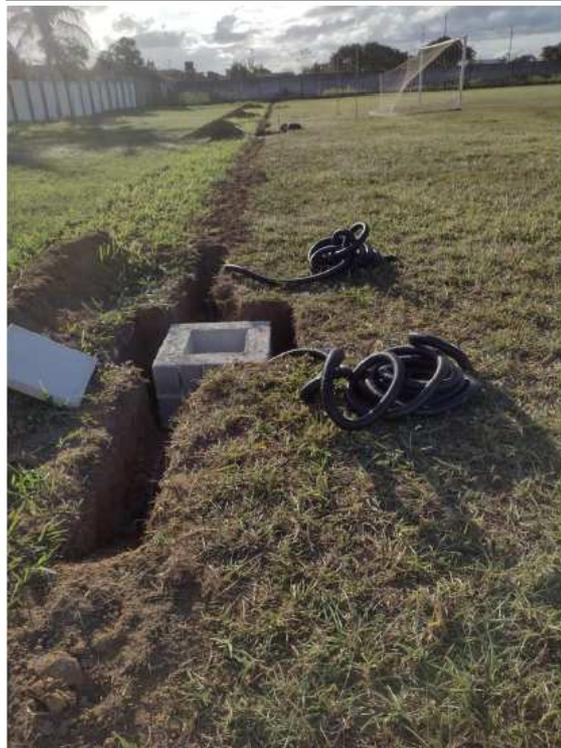


Foto 04 – Escavação de vala para implantação dos postes .



Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Ced. 60.520.107-9
CAU N.º A-12275-0
