



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS.

Data da Vistoria  
27/07/2022

|   |   |
|---|---|
| <b>Município</b><br>Mortugaba                           | <b>Assunto</b><br>Vistoria de Convênio            |
| <b>Interessado</b><br>Prefeitura Municipal de Mortugaba | <b>Responsável</b><br>Heraclito Luiz Paixão Matos |
| <b>Contato</b><br>Elder Silveira Sousa                  | <b>Cargo</b><br>Engenheiro                        |

**Objeto**  
Implantação do Sistema de Iluminação em Led do Estádio

**Endereço**  
Sede do Município

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Convênio</b><br>12/22                  | <b>Processo</b><br>069.1479.2022.0000410-53 | <b>Nº de Parcelas</b><br>02 (duas)        | <b>Parcela Vistoriada</b><br>1º Vistoria da 1ª Parcela |
| <b>Publicação no D.O.E.</b><br>31/03/2022 | <b>Valor do Convênio</b><br>R\$ 408.637,56  | <b>Valor da Parcela</b><br>R\$ 202.225,11 |  |

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Mortugaba, onde foi vistoriada a obra de, objeto Implantação do Sistema de Iluminação em Led do Estádio, objeto do convênio nº 12/22, no valor de R\$ 408.637,56 (quatro centos e oito mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.  
Segue abaixo a planilha dos serviços:

| SERVIÇOS  | 1ª PARCELA        |                   |                | CONVÊNIO          |                   |               |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
|   | Valor parc.       | Valor Exec.       | perc (%)       | Valor total.      | Valor Exec.       | Perc (%)      |
| ADMINISTRAÇÃO   | 15.227,52         | 15.227,52         | 100,00%        | 30.455,04         | 15.227,52         | 50,00%        |
| SERVIÇOS PRELIMINARES   | 26.787,16         | 26.787,16         | 100,00%        | 26.787,16         | 26.787,16         | 100,00%       |
| IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL | 160.210,43        | 190.761,06        | 119,07%        | 320.420,86        | 190.761,06        | 59,53%        |
| INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO                         | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 11.875,00         | 0,00              | 0,00%         |
| LIMPEZA GERAL   | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 19.099,50         | 0,00              | 0,00%         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>202.225,11</b> | <b>232.775,74</b> | <b>115,11%</b> | <b>408.637,56</b> | <b>232.775,74</b> | <b>56,96%</b> |

**Obs.: OBRA PARALISADA.**

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 12/22, no valor de R\$ 202.225,11 (duzentos e dois mil e duzentos e vinte e cinco reais e onze centavos).

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Responsável</b><br>Luiz Antonio Almeida Brantes                                  | <b>Cargo / CREA/Cadastro</b><br>Arquiteto<br>CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9 | <b>Data do Relatório</b><br><br><b>29/08/2022</b> |
| <b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b><br>Luiz Antonio Almeida Brantes |   |   |

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Implantação de Iluminação do Estádio Municipal De Mortugaba, Município de Mortugaba,  
Convênio 12/22.**

**FOTO 01 – Barracão de obra.**



**FOTO 02 – Escavação de valas para eletroduto.**




*(Handwritten signature)*

**Implantação de Iluminação do Estádio Municipal De Mortugaba, Município de Mortugaba,  
Convênio 12/22.**

**FOTO 03 – Padrão de entrada.**



**FOTO 04 – Quadro elétrico com passagem dos fios.**

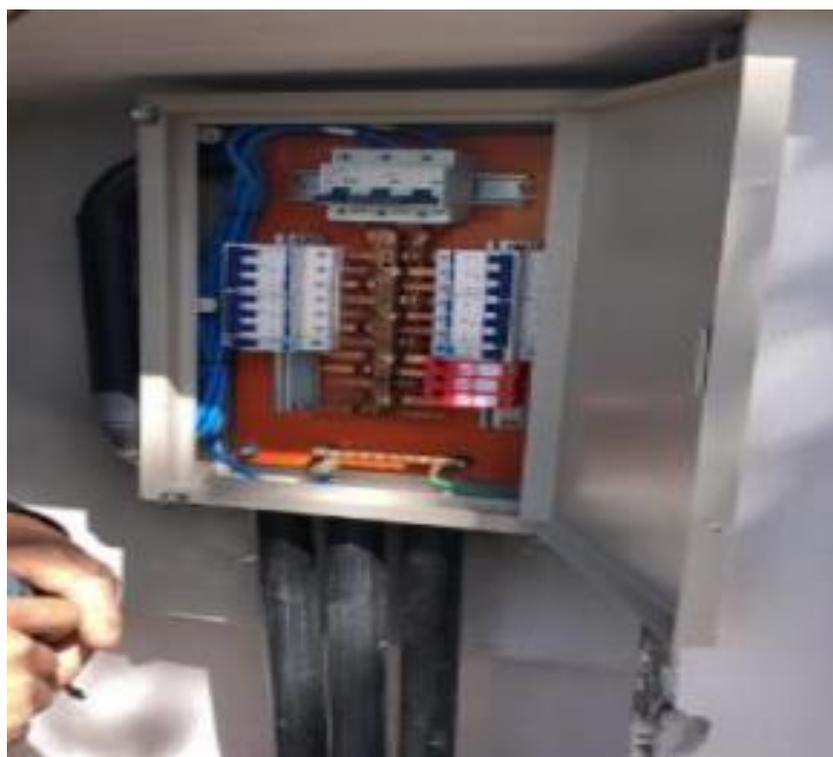

*(Handwritten signature)*

**Implantação de Iluminação do Estádio Municipal De Mortugaba, Município de Mortugaba,  
Convênio 12/22.**

**FOTO 05 – Execução da base do totem.**



**FOTO 06 – Instalação dos postes.**



*Antonio Brantes*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 68 520 107-9  
CAU N° A-12275-0
