



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da
Vistoria
19/05/2020

Município Gentio do Ouro		Assunto Vistoria de Convênio	
Interessado Prefeitura Municipal de Gentio do Ouro		Responsável Robério Gomes Cunha - Prefeito	
Contato Robério Gomes Cunha		Cargo Prefeito	
Objeto Reforma do Estádio Municipal			
Endereço Sede do Município			
Convênio 04/18	Processo 1602170034426	Nº de Parcelas 03 (Três)	Parcela Vistoriada 1ª Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 23/02/2018		Valor do Convênio R\$ 650.440,13	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 250.314,34

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Gentio do Ouro, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal objeto do convênio nº 04/18, no valor de R\$ 650.440,13 (seiscentos e cinquenta mil quatrocentos e quarenta reais e treze centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
VESTIÁRIO PADRÃO TIPO C-3	68.099,29	49.992,74	73,41%	68.099,29	49.992,74	73,41%
ALAMBRADO DE H 1,5M COMP TOTAL 500M	182.215,05	182.215,05	100,00%	218.658,06	182.215,05	83,33%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMP= 50,00M		18.106,55		170.334,45	18.106,55	10,63%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO PARA DIMENSÕES OFICIAIS 107 X 70M				193.348,33		0,00%
TOTAL	250.314,34	250.314,34	100,00%	650.440,13	250.314,34	38,48%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 04/18, no valor de R\$ 250.314,34 (duzentos e cinquenta mil e trezentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos)

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo/CREA/Cadastro Luiz Antonio Almeida Brantes Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD. 69.520.107-9	Data do Relatório 29/05/2020
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01 - Revestimento do Vestiário

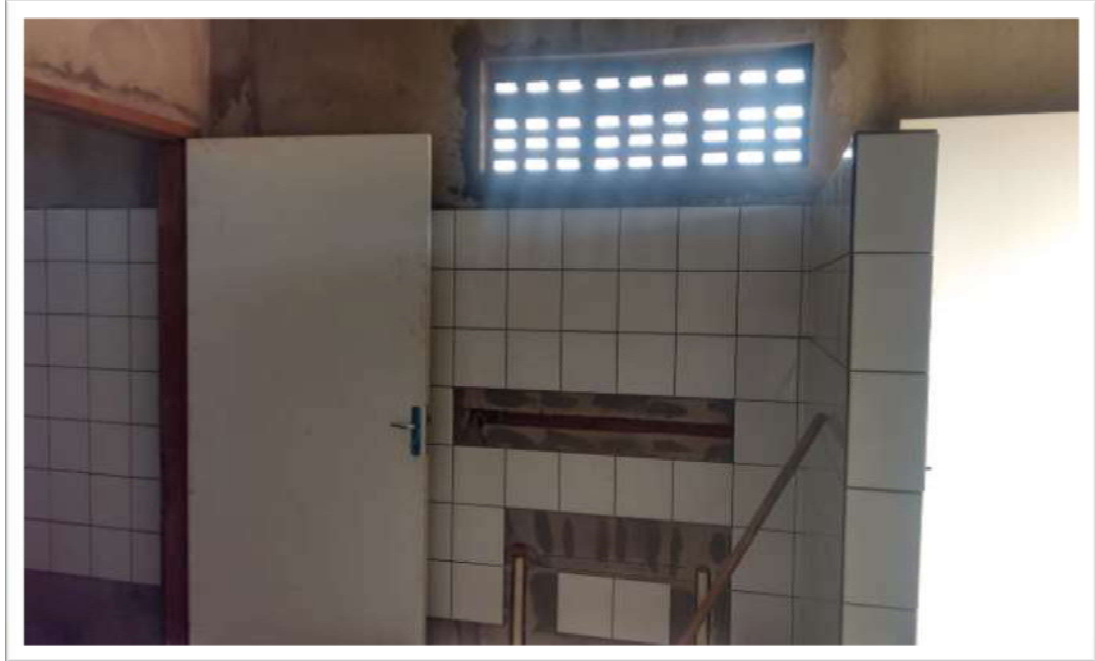


Foto 02 - Vista lateral do Vestiário



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 03 - Vista mureta e perfis do alambrado



Foto 03 - Execução da Arquibancada

