



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/04

Data da Vistoria
27/07/2023

Município Lapão	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Lapão	Responsável Marcio Antônio Messias da Silva
Contato Carolina Neiva Messias	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol Waldemar José de Carvalho

Endereço
Sede do Município

Convênio 22/21	Processo 069.1474.2021.0003809-18	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 4ª Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 18/01/2022	Valor do Convênio R\$ 832.927,13		Valor da Parcela Vistoriada R\$ 393.274,97

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Lapão, onde foi vistoriada a obra de Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol Waldemar José de Carvalho, município de Lapão, objeto do convênio nº 22/21 no valor de R\$ 832.927,13 (oitocentos e trinta e dois mil novecentos e vinte e sete reais e treze centavos) foi constatado que a obra está concluída.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22.179,96	22.179,96	100,00%	44.359,92	44.359,92	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES				25.929,43	25.929,43	100,00%
CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DE ARQUIBANCADA (COM CABINE)	187.202,45	187.202,45	100,00%	374.404,91	374.404,91	100,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	102.170,16	102.170,16	100,00%	306.510,47	306.510,47	100,00%
PAVIMENTAÇÃO	27499,55	27499,55	100,00%	27.499,55	27.499,55	100,00%
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA EM ACM	41230,00	41230,00	100,00%	41.230,00	41.230,00	100,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11780,00	11780,00	100,00%	11.780,00	11.780,00	100,00%
LIMPEZA FINAL DA OBRA	1212,85	1212,85	100,00%	1.212,85	1.212,85	100,00%
TOTAL	393.274,97	393.274,97	100,00%	832.927,13	832.927,13	100,00%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 22/21, no valor de R\$ 393.274,97 (trezentos e noventa e três mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

Responsável Carlos A.C. de Oliveira.	Cargo Analista Técnico	Data do Relatório 28/07/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Carlos Antonio Carvalho de Oliveira
Analista Técnico Nível B
Projeto FLEM/SUDES B


Luiz Antonio Almeida Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N° A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol Waldemar José de Carvalho,
Município de Lapão, Convênio 22/21.**

Foto 01 -- GABINETE COM ESQUADRILHAS DE VIDROS.



Foto 02 – Implantação do Sistema de Iluminação.

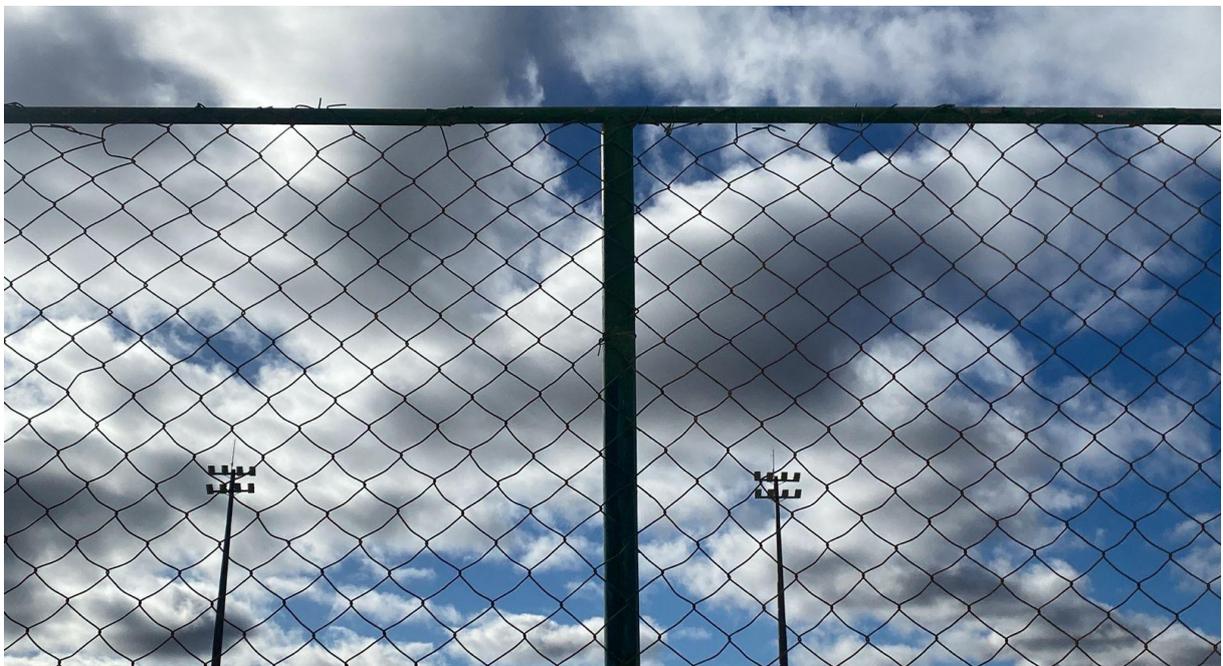

Carlos Antonio Carvalho de Oliveira
Carlos Antonio Carvalho de Oliveira
Analista Técnico Nível B
Projeto FLEM/SUDES8

Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69 520, 107-9
CAU N.º A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol Waldemar José de Carvalho,
Município de Lapão, Convênio 22/21.**

FOTO 03 – Pavimentação.



FOTO 04 – PÓRTICO.



Carlos Antonio Carvalho de Oliveira
Carlos Antonio Carvalho de Oliveira
Analista Técnico Nível B
Projeto FLEM/SUDES B

Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad 68 520 107-9
CAU N° A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol Waldemar José de Carvalho,
Município de Lapão, Convênio 22/21.**

FOTO 05 -PÓRTICO.



FOTO 06 – TOTEM.



Carlos Antonio
Carlos Antonio Carvalho de Oliveira
Analista Técnico Nível B
Projeto FLEM/SUDES8

Luiz Antonio
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520.107-9
CAU N.º A-12275-0
