



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/04

Data da Vistoria
06/03/2024

Município Nova Fátima	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Nova Fátima	Responsável José Adriano Santos Pereira
Contato Gerbes Barbosa Gomes	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal José Belzair dos Santos

Endereço
Sede do Município

Convênio 02/21	Processo 069.1479.2021.0001899-63	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 4º Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 20/10/2021		Valor do Convênio 893.807,79	Valor da Parcela Vistoriada 446.903,90

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Nova Fátima, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal José Belzair dos Santos município de Nova Fátima, objeto do convênio nº 02/21 no valor de R\$ 893.807,79 (oitocentos e noventa e três mil e oitocentos e sete reais e setenta e nove centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22.094,16	22.094,16	100,00%	44.188,32	44.188,32	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	-			9.814,67	9.814,67	100,00%
REFORMA DO ALAMBRADO EXISTENTE	83.756,95	83.756,95	100,00%	251.270,86	251.270,86	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 50M COM	124.176,20	124.176,20	100,00%	256.779,89	256.779,89	100,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	114.877,47	114.877,47	100,00%	229.754,93	229.754,93	100,00%
PAVIMENTAÇÃO	45.620,14	45.620,14	100,00%	45.620,14	45.620,14	100,00%
BANCO DE RESERVAS	35.625,00	35.625,00	100,00%	35.625,00	35.625,00	100,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	9.629,98	9.629,98	100,00%	9.629,98	9.629,98	100,00%
LIMPEZA GERAL	11.124,00	11.124,00	100,00%	11.124,00	11.124,00	100,00%
TOTAL	446.903,90	446.903,90	100,00%	893.807,79	893.807,79	100,00%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 02/21, no valor de R\$ 446.903,90 (quatrocentos e quarenta e seis mil e novecentos e três reais e noventa centavos).

Responsável: Carlos A. C. Oliveira.	Cargo / ANALISTA TECNICO	Data do Relatório 07/03/2024
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brandes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.	

Carlos Antonio Carvalho de Oliveira
Analista Técnico Nivel B
Projeto FLEM/SUDES B

Luiz Antonio Brandes
Luiz Antonio B. antes
Coordenador de Obras / SUDES B
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Belzair dos Santos, Município de Nova Fátima, Convênio 02/21.

Foto 01 – Vista da entrada do Estádio.



Foto 02 – Vista do Alamedado.



[Handwritten signature]


[Handwritten mark]

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Belzair dos Santos, Município de Nova Fátima, Convênio 02/21.

FOTO 03 – Vista da Arquibancada.



FOTO 04 – Vista do Campo, Arquibancada e Torres de Iluminação.

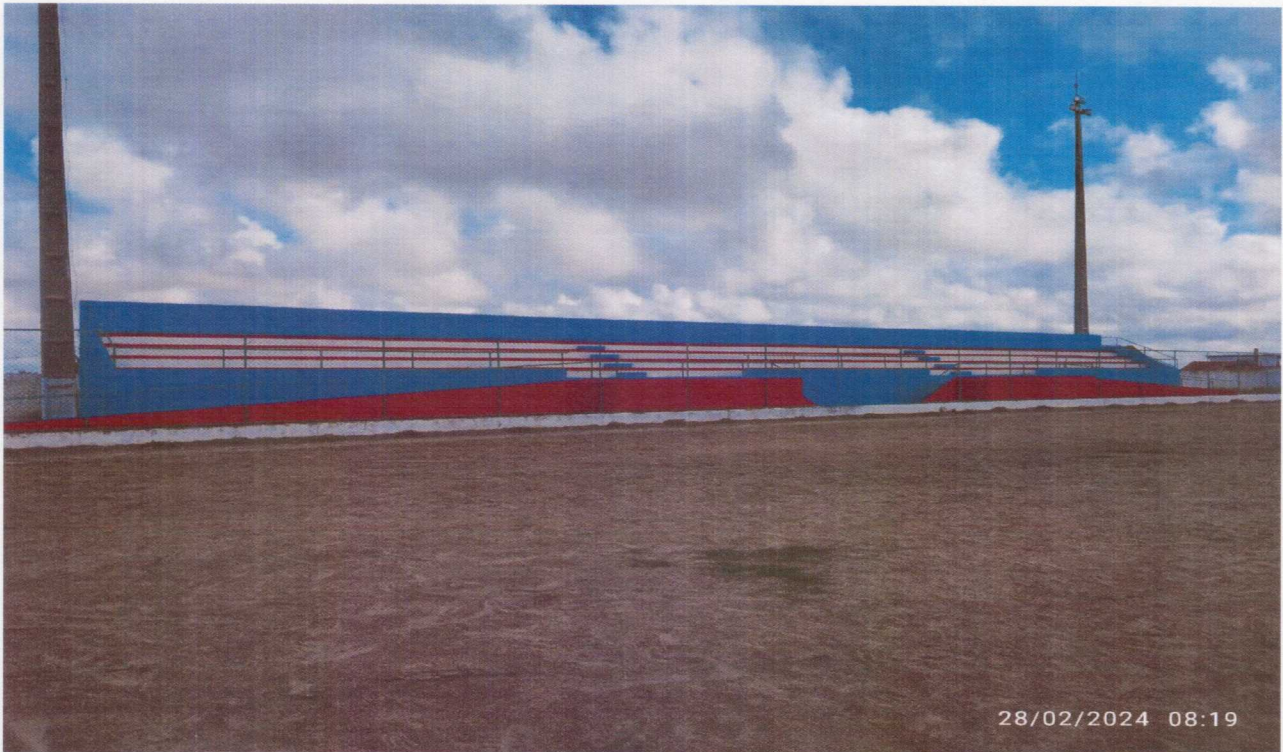

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Belzair dos Santos, Município de Nova Fátima, Convênio 02/21.

FOTO 05 – Vista da torre de Iluminação.



Foto 06 – TOTEM.

