



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Esportes do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS.

Data da Vistoria
18/12/2019

Município Paripiranga	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Paripiranga	Responsável Justino das Virgens Neto - Prefeito
Contato ANTONIO SANTANA CARREGOSA	Cargo Secr. Administração Engenheiro Civil

Objeto
Construção de Reforma Estádio

Endereço
Município - Sede

Convênio 07/2018	Processo 1602170026253	Nº de Parcelas: 03 (três)	Parcela vistoriada 1ª vistoria - 2ª parcela
Publicação no D.O. E. 21/04/18	Valor da Obra R\$ 369.484,92	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 155.770,35	

LAUDO TÉCNICO:
Em visita ao Município de Paripiranga, foi vistoriada a obra de Construção de reforma estádio, objeto do convênio nº 07/2018, no valor de R\$ 369.484,92 (Trezentos e sessenta e nove mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

ITEM	SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
		Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
1.0	Iluminação do campo	66.521,62	66.521,62	100,00%	221.738,73	155.217,11	70,00%
2.0	Campo gramado com dimensões oficiais 107x70	49.248,73	49.248,73	100,00%	147.746,19	98.497,46	66,67%
	TOTAL	115.770,35	115.770,35	100,00%	369.484,92	253.714,57	68,67%

Avaliação da obra:

- Pelos dados expostos acima, damos como cumprida a 2ª parcela do convênio nº 07/2018, no valor de R\$ 115.770,35 (Cento e quinze mil setecentos e setenta reais e trinta e cinco centavos).

CONCLUSÃO:

Responsável Luiz Antônio A. Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data 20/12/2019
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes		

Relatório Fotográfico

Foto 01 – Vista Geral destacando o gramado e a iluminação



Foto 02 – Vista Geral destacando teste dos refletores

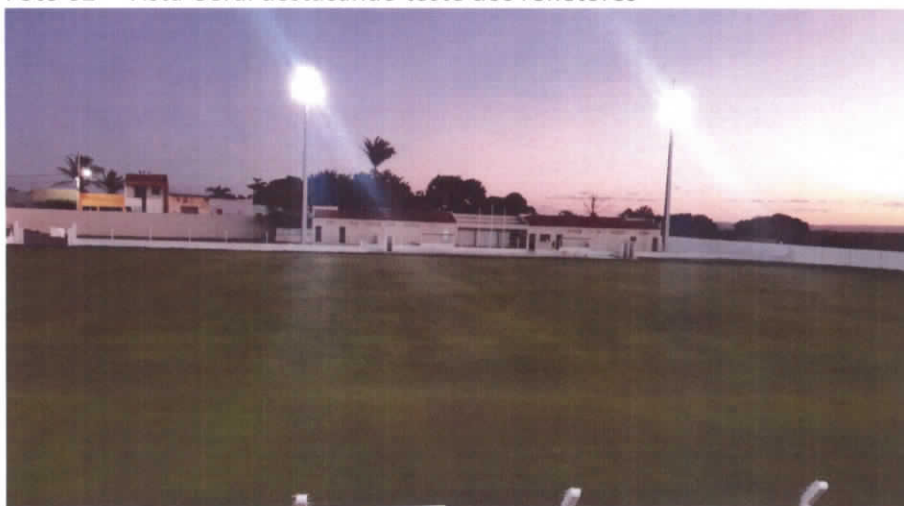


Foto 03 – Vista parcial destacando detalhe do gramado.



10
