



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
16/09/2022

<b>Município</b> Dom Macedo Costa	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa	<b>Responsável</b> Eginaldo Piton Moura
<b>Contato</b> Adriana Santos Reis	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Reforma da Quadra Poliesportiva Antônio dos Santos Froes

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 06/21	<b>Processo</b> 069.1479.2021.0001922-47	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 2º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 04/12/2021		<b>Valor do Convênio</b> 949.912,84	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> 369.458,85

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Dom Macedo Costa, onde foi vistoriada a obra de Reforma da Quadra Poliesportiva Antônio dos Santos Froes, município de Dom Macedo Costa, objeto do convênio nº 06/21 no valor de R\$ 949.912,84 (novecentos e quarenta e nove mil e novecentos e doze reais e oitenta e quatro centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.  
Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	14.729,44	14.729,44	100,00%	44.188,32	14.729,44	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	26.580,65	26.580,65	100,00%	26.580,65	26.580,65	100,00%
REFORMA DO VESTIÁRIO E ÁREA DE CONVIVÊNCIA	99.233,18	27.965,03	28,18%	165.388,64	27.965,03	16,91%
REFORMA DO ALAMBRADO	48.287,13	2.392,12	4,95%	48.287,13	2.392,12	4,95%
QUADRA - SERVIÇOS COMPLEMENTARES				97.831,62	0,00	0,00%
DEMOLIÇÃO DA ARQUIBANCADA EXISTENTE	20.195,26	20.195,26	100,00%	20.195,26	20.195,26	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS COMPRIMENTO 20M COM ACESSIBILIDADE (SUDESB)	33.989,39	33.989,39	100,00%	67.978,77	33.989,39	50,00%
COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA (PROJETO PREFEITURA)	126.443,80	243.606,96	192,66%	442.553,31	243.606,96	55,05%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V (COBERTURA QUADRA)				19.186,24	0,00	0,00%
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)				3.064,90	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DO TOTEM				11.875,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL				2.783,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>369.458,85</b>	<b>369.458,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>949.912,84</b>	<b>369.458,85</b>	<b>38,89%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 06/21, no valor de R\$ 369.458,85 (trezentos e sessenta e nove mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  19/09/2022
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 68.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma da Quadra Poliesportiva Antônio dos Santos Froes, Município de Dom Macedo Costa, Convênio 06/21.**

**Foto 01 – ARQUIBANCADA.**



**Foto 02 – INSTALAÇÃO DOS PILARES METÁLICOS.**

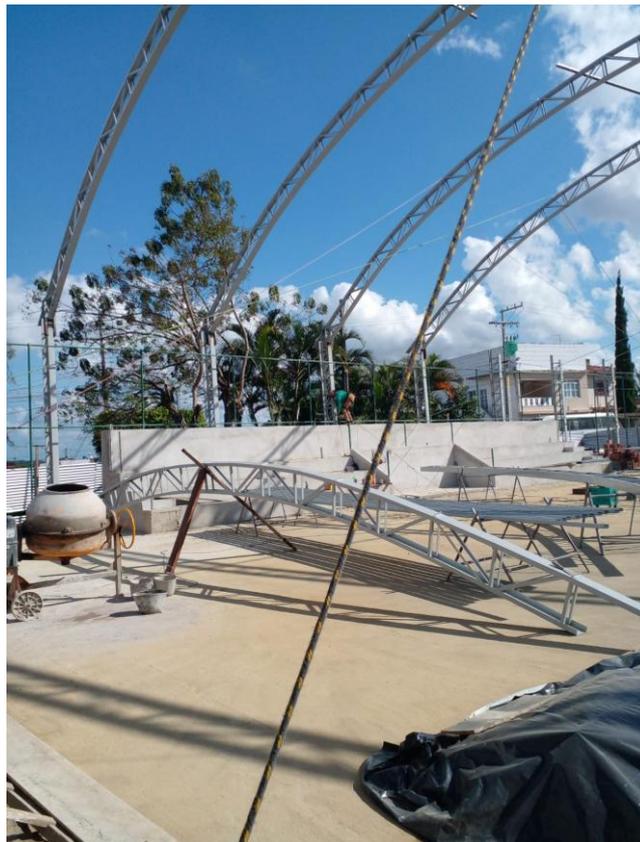

*(Assinatura manuscrita)*

**Relatório Fotográfico da Reforma da Quadra Poliesportiva Antônio dos Santos Froes, Município de Dom Macedo Costa, Convênio 06/21.**

**Foto 03 – REFORMA DO VESTIÁRIO.**



**Foto 04 – ARMAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA.**



*Luiz Antonio Brantes*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 68 520 107-9  
CAU Nº A-12275-0
